

27751

92

U. S.

BIBLIOTEKA
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ODBUDOWA STOLICY

Sprawozdanie Nr.7 za czas 1 - 31.8.45.

BIBLIOTEKA
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

己未年

正月

初一日

正月初一日

正月初一日

己未年正月初一日

Na podstawie uzyskanego doświadczenia zostaje zmieniony układ sprawozdań okresowych z "Odbudowy Stolicy". Całokształt sprawozdania dzielić się będzie na trzy zasadnicze działy, a mianowicie:

Dział A. - zawierający krótki przegląd prac wykonanych podany w formie tabelarycznej.

Dział B. - zawierający prace ukończone w zakresie planowania i projektowania. W tym dziale będą uwzględnione tylko ważniejsze zagadnienia, mające charakter kluczowy dla Odbudowy Stolicy, bądź też wiążące się integralnie z realizacją w najbliższych etapach. Prace o charakterze długofalowym, badawczonaukowym, jak również prace mniejsze oraz czynności o charakterze administracyjno-nadzorczym w sprawozdaniu zamieszczane nie będą.

Dział C. - zawierający wyniki realizacji. W dziale tym wobec posiadanego już znacznego materiału za okresy ubiegłe będzie nasświetlona dynamika postępu robót w porównaniu z planem. W tym celu opracowano specjalne znormalizowane wykresy, które z jednej strony ujmują funkcjonalnie robotę i czas, z drugiej zaś dają porównawczy procentowo-liczbowy obraz z wykonania w zależności od planu.

A. . Krótki przegląd prac wykonanych
przy Odbudowie Stolicy na 1.9.1945r.

		Warszawa prawo- i lewobrzeżna					
LpU	T r e ś ć	Jedn.	Stan przed znisz- czeniem	Wykonano Do okresu sprawozd.	W okresie sprawozd.	Razem	% stos do sta rnu prz. znisz- czeniem
<u>Elektrownia</u>							
1.	Moc	KV	95000	35000	12000	47000	50
2.	Kable zasil. 15 KV	km	99,00	42,70	5,20	47,90	48
3.	" " 5 KV	"	115,00	27,05	2,34	29,39	26
4.	" rozdz. 5 KV	"	50,00	37,71	20,13	57,84	29
5.	" niskiego napięcia	NN	750,00	131,78	18,00	149,78	20
6.	Stacje transform.	szt.	1620	413	76	489	30
7.	Transformatory	"	brak dan.	70	25	95	-
8.	Lampy uliczne	"	7000	236	91	327	4,5
9.	Podstacje	"	-	70	11	81	1
10.	Remont budynków	"	253,3	124,0	25,6	169,6	66
			100	51	19	70	-
<u>Wodociągi i Kanaliz.</u>							
11.	Wydatek wody	m ³ /d	140000	14000	8000	22000	16
12.	Nawodn.sieci wod. ✓	km	630,00	153,06	51,06	214,12	34
13.	Bruchomienie studni artez.	szt.	-	7	-	7	-
14.	Punkty czerpalne	"	-	70	-	70	-
15.	Przyłączenie nieru- chomości	"	13928	1176	805	1981	14
16.	Kontrola i naprawa sieci kanaliz.	km	357,00	146,36	3,55	149,91	42
17.	Czyszcz. i kontrola różn.obiektów kanal.	"	-	948	451	1399	-
<u>Gazownia</u>							
18.	Żołność produkcyjna	m ³ /d	200000	28000 ^x	-	28000	14 ^x
19.	Odbudowa sieci	km	708,44	62,10	26,96	89,06	13
20.	Sieć oddana do eks- ploatacji	km	708,44	54,20	19,46	73,66	10
21.	Włączono konsum.	szt.	116033	1001 ^{xx}	1760	2761	2,5
22.	Remont urządzeń fabrycznych	"	-	-	-	-	-
	a) Fabr.Gazu	%	100	-	-	35	35
	b) " Chem.	%	100	-	-	75	75
<u>M.Ż.K.</u>							
	Sieć jezdną	mb.	-	19000	15000	34000 na	1:8.
	Tor użytkowy	mtp.	256410	112900	brak danych		145.
	Tor w eksploatacji	mtp.	224490	14700	1900	12600	-

Warszawa prawo- i lewobrzeżna							
Lp.	T r e ś ć	Jedn.	Stan przed znies- cze- niem	W y k o n a n o			% w stos. do sta- nu prz. znieszc.
				Lo okresu spraw.	W okresie spraw.	Razem	
26.	Ilość linii w ruchu	szt	39	4	1	5	13
27.	Ilość wozów wyfem. siln. przyoz.	"	398 324	23 ⁺ 26 ⁺	9 7	32 33	8 10
V.	<u>Budownictwo wodne</u>						
28.	Naprawa wałów roboty ziemne	m ³ /tyś	--	--	--	56,2	--
29.	Naprawa kanał.kryt.	km	--	--	--	13,6	--
30.	Naprawa kanał.otw.	"	--	--	--	10,7	--
VI.	<u>Roboty mostowe</u>						
31.	Odbudowa wiaduktu Mostu Poniatowsk.	%	--	16	16	32	--
32.	Konserwacja mostu przy ul.Karowej	--	r o b o t y c z a g ł e				
VII.	<u>Asfalt nawierzch.ul.</u>						
33.	Zabrukowano jezdni	m ²	--	40147	35314	75661	--
34.	Ułożono chodników	"	--	33893	22144	56037	--
VIII.	<u>Odbudowa i remont nieruchomości.</u>						
35.	Roboty ukończone	tyś/m ³	--	671,7	39,8	711,5	--
36.	Roboty w toku	--	--	2391,5	2946,9	--	--
37.	Budowa prow.baraków ukończone	"	--	--	1,1	1,1	--
38.	w toku	"	--	--	162,0	--	--
39.	Łomki fińskie	%	--	100	--	100	--
40.	Ujazdów Górny	%	--	35	19	54	--
41.	Ujazdów Dolny Mokotów	%	--	15	15	30	--
IX.	<u>Roboty rozbiórk.porz.</u>						
42.	Rozbiórka budynków	m ³	--	733,28	205,72	939,00	--
43.	Wywóz gruzu	"	--	279,42	30,95	310,37	--
44.	Rozbiórka stropów	m ²	--	12,79	5,04	17,83	--
45.	Wydobycie żelaza	t.	--	1,29	0,33	1,62	--
46.	Saldo cegieł	szt	--	6702,15	5597,25	--	--
47.	Oczyszczenie i se- reg.cegieł	w tyś	--	--	738,7	--	--

U w a g i:

- * w poprzednim sprawozdaniu podana była maksymalna zdoln.produkc.
- xx/ Podana cyfra dotyczyła stanu na 1.7.45r.
- +/ W poprzednim sprawozdaniu podane cyfry dot.wozów dla których wykonał remont podstawowy bez wykończenia zewnętrzzn.jak malowanie,askle-
nie itp.Obecnie będą podawane ilości wozów zdalnych do ruchu

B. PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE

a/ Prace inwentaryzacyjne i pomiarowe.

1. Przeprowadzono lustrację nieruchomości w Warszawie lewobrzeznej pod względem bezpieczeństwa publicznego.
2. Opracowano inwentaryzację ulic Dzielnicy Rządowej.
3. Wykonano w 70% pomiary terenowe stanu nawierzchni głównych arterii ruchu.

b/ Zagadnienia komunikacyjne.

1. Opracowano schemat układu torów, skrzyżowań i urządzeń w W.Z.M.
2. Opracowano układ sieci komunikacji miejskiej szybkiej w obrębie Dzielnicy Centralnych W.Z.M.
3. Zaprojektowano schemat układu torów na stacji osobowej Warszawa Główna.

c/ Zagadnienia hydrograficzne.

1. Wykonano pomiary terenowe oszczędności skarpy warszawskiej (Łazienki - Służewiec) w związku z projektem melioracyjnym.
 2. Zestawiono źródła zaopatrzenia w wodę osiedli podstołecznych na prawym brzegu Wisły.
 3. Obliczono zasoby wód artesyjskich w studniach Warszawy i okolic.
- 4/ Opracowano przybliżone zużycie energii i środków energetycznych oraz analizę sposobu ich pokrycia dla W.Z.M. i Okręgu Stołecznego w latach 1946 - 70.
- a/ Opracowano w pierwszym przybliżeniu program zatrudnienia w przemyśle mieszkaniowym W.Z.M.

2. Tereny zielone.

1. Przeprowadzono rejestrację szkół w Ogrodzie Zoologicznym.
 2. Obliczono zapotrzebowanie na tereny zielone dla Dzielnicy Koło.
 3. Opracowano projekt odrozwinięcia skarpy na odcinku Belweder - Królikarnia.
- g/ Opracowano plany obszarów Nowe Bródno i Polcowizna.

h/ Wykonano szkicowe projekty zabudowy dzielnicy mieszkaniowej Muranova i wzdłuż ulicy Marszałkowskiej.

1/ Zakończono studia nad typowymi rozwiązaniami mieszkań i odpowiednich elementów z podbudową gospodarszą.

1/ Opracowano normy ślusarskich elementów budowlanych i okien stalowych.

k/ Zapadnienia inżynierskie.

1. Określono nośność filarów mostu Kierbedzia.

2. Opracowano projekt wzmocnienia isb i filarów mostu drewnianego przy ul. Karowej.

3. Opracowano projekt konstrukcji Hali Warsztatowej M.Z.Kz przy ul. Młynarskiej.

1/ Przepracowano plan gospodarki łącznie z budżetem na III kwartał w związku ze zmniejszeniem kredytów.

n/ Opracowano program prac na IV kwartał i plan realizacyjny na wrzesień.

n/ Projekty i kosztorysy.

Lp.:	Rodzaj	Do okresu spr.:		w okresie spr.:		Razem	
:	:	Ilość	m ³ w tys.	Ilość	m ³ w tys.	Ilość	m ³ w tys.
1.	Remontowe	175	2.140,2	84	1.129,3	259	3.269,5
2.	Instal. X. Ugrz.	225	2.257,9	150	1.368,1	375	3.626,0
3.	" elektrycz.	115	920,2	113	1.678,4	228	2.598,6
















o/ Dokumentarne prace w zakresie Architektury Zabytkowej.












Lp.:	Treść	Do okr. spr.	W okr. spr.	Razem
1.	Rysunki obecnego stanu budynków zabytkowych.	62	12	74
2.	Ścisłe pomiary budynków zabytk.	30	5	35
3.	Projekty zabezp. budynków "	117	5	122
4.	Kosztorysy budynków zabytk.	100	20	120

Dział C. - Realizacja

BOS.

ELEKTROWNIA

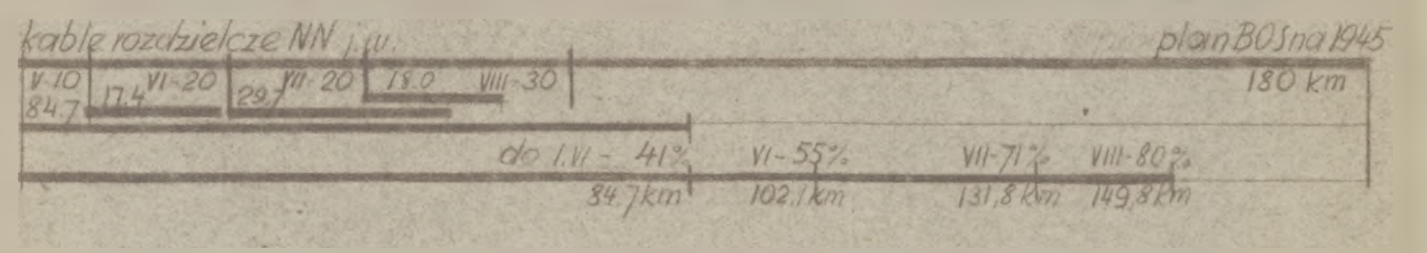


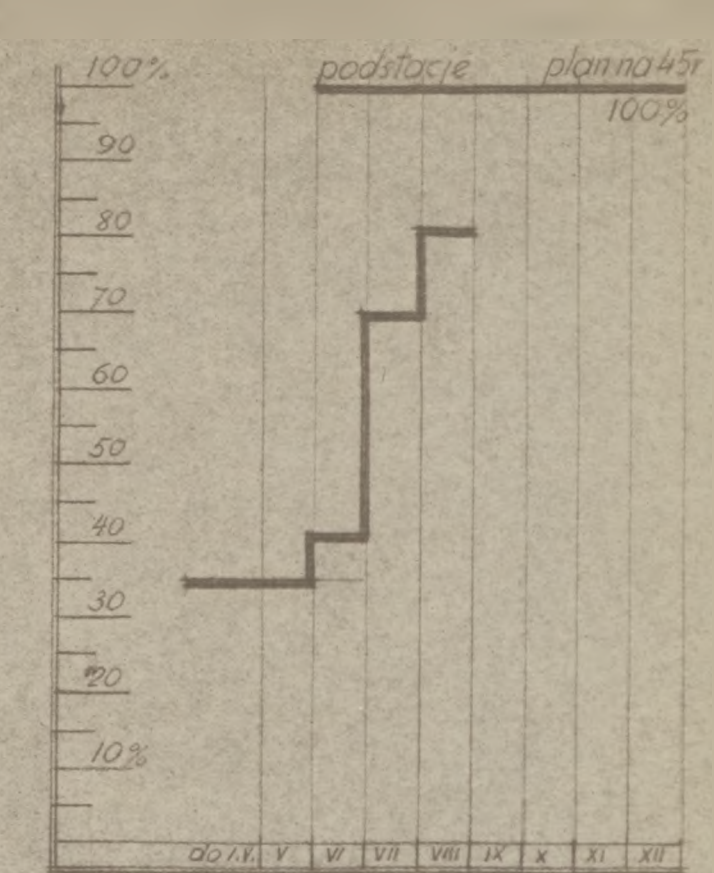
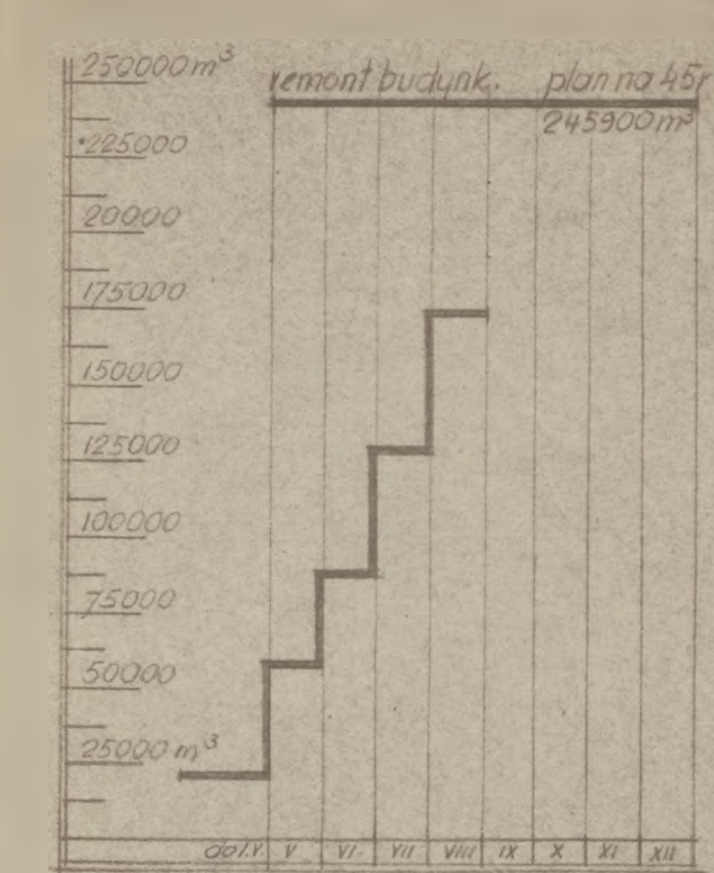
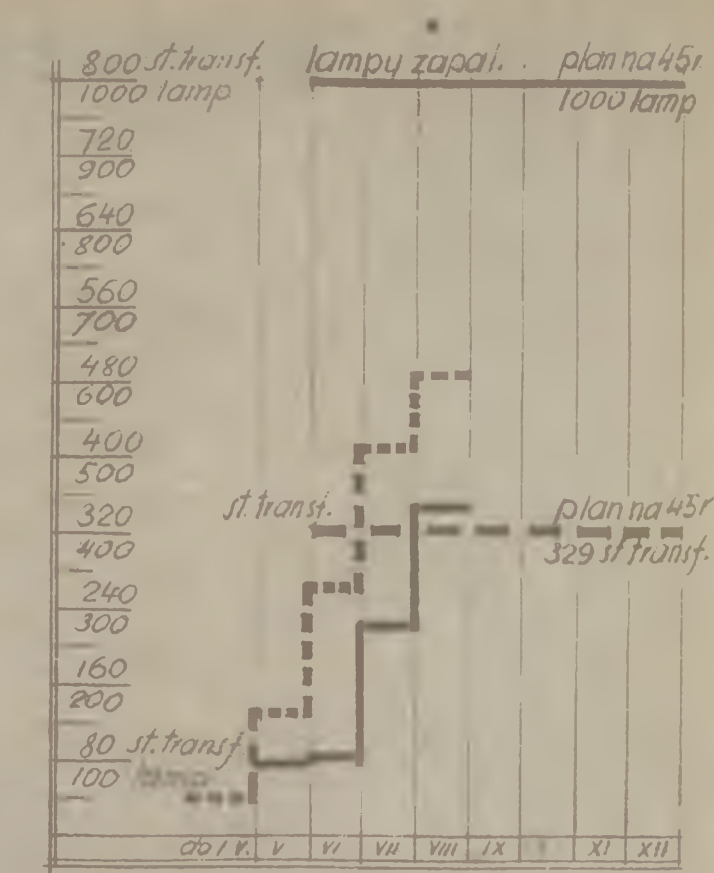
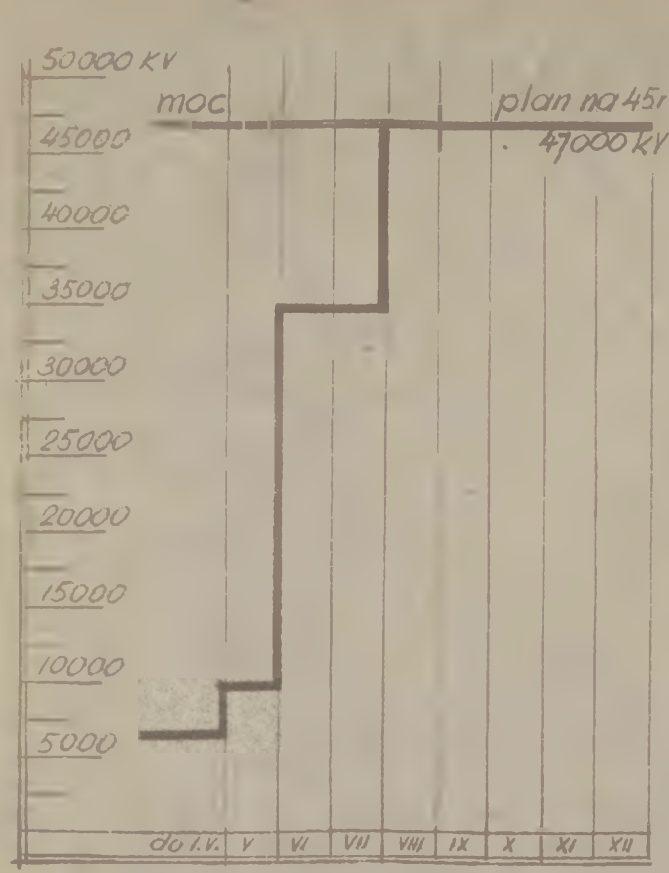
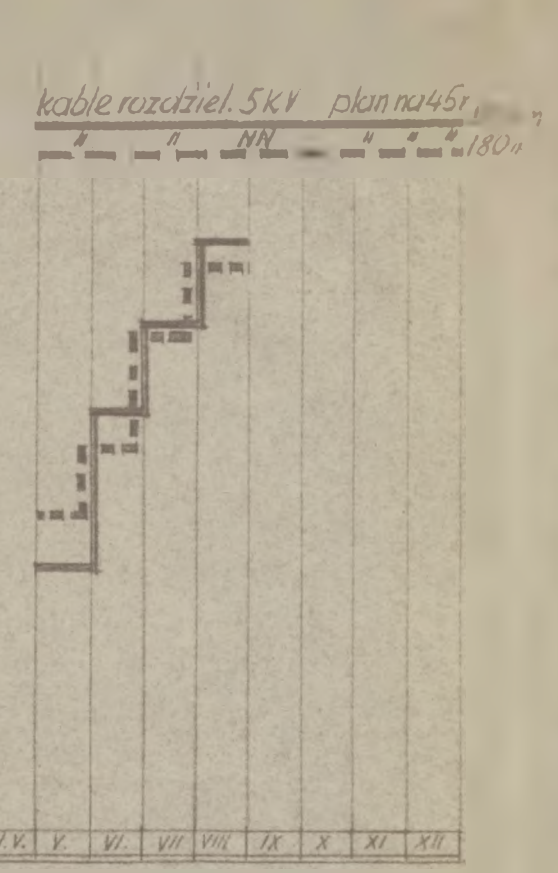
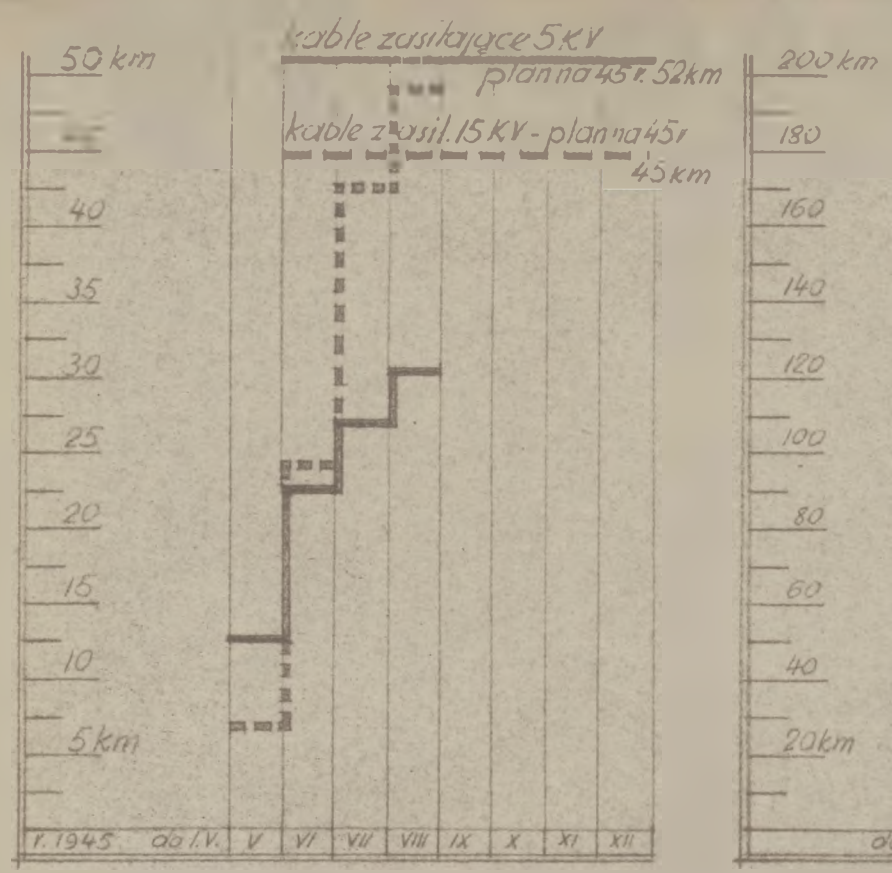


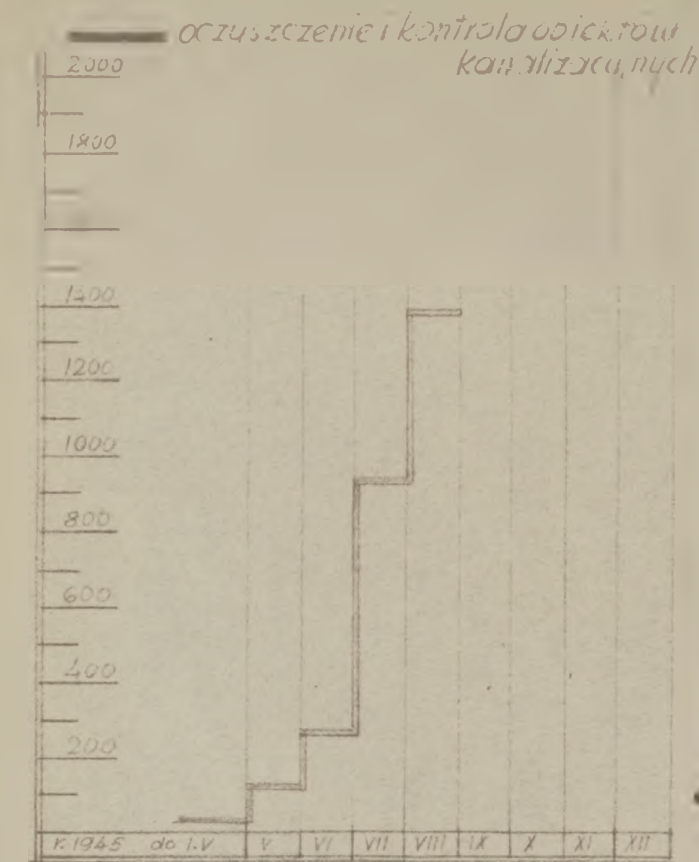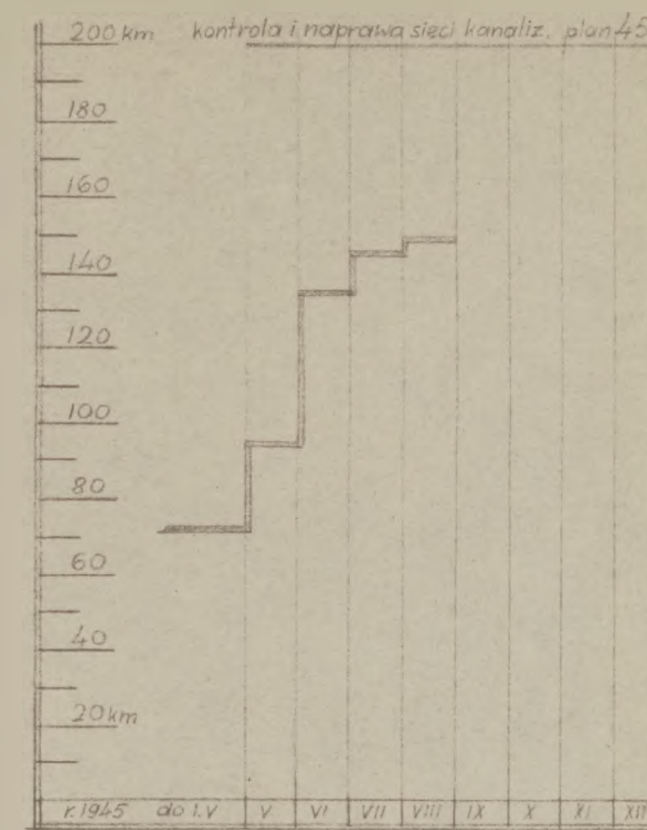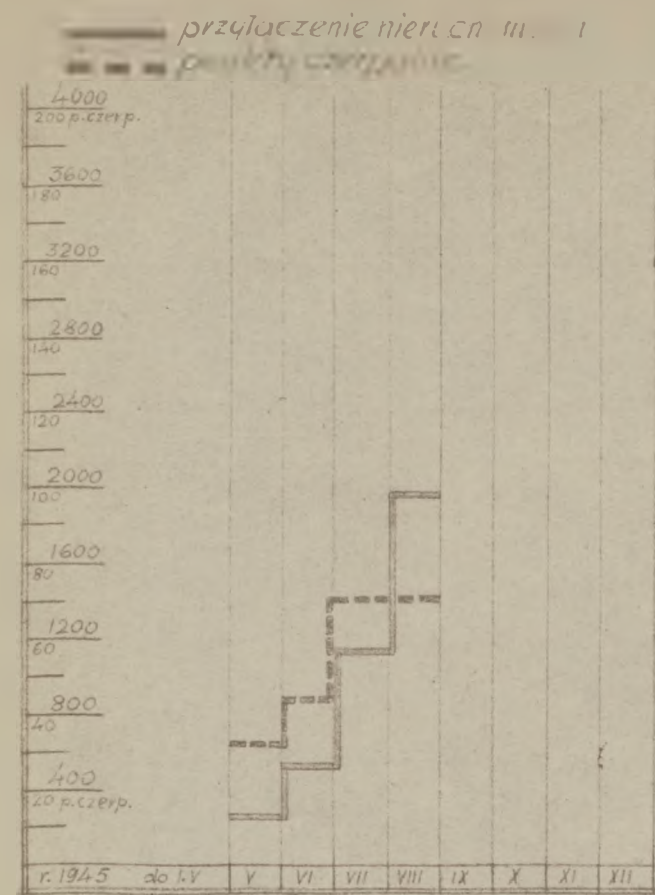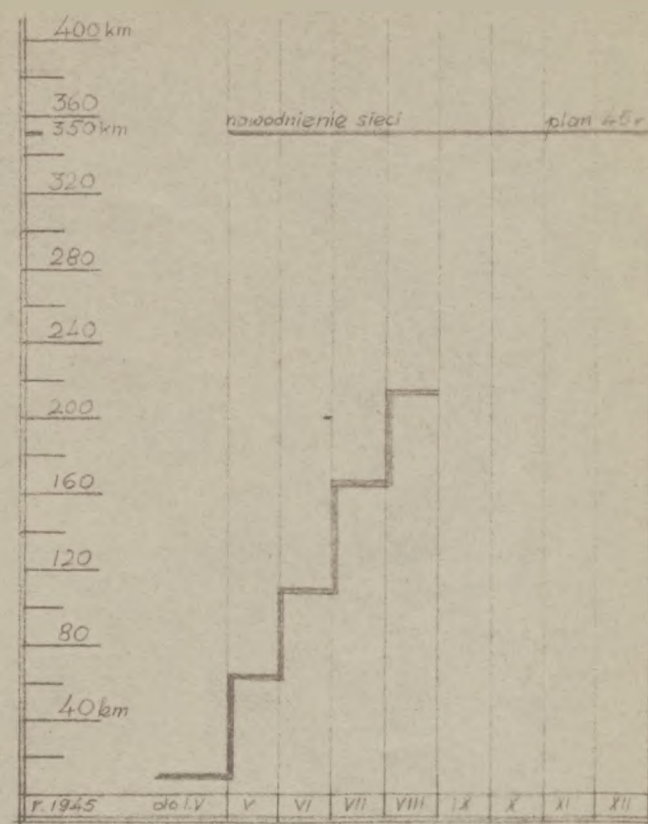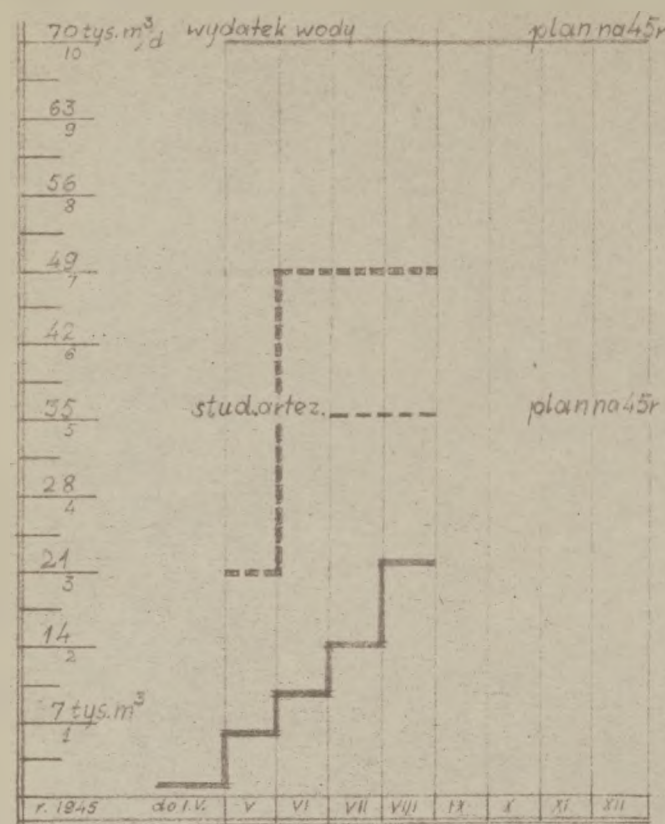

oczyszczanie i kontrola obiektów kanalizacyjnych	VII. 659	948
ogółem	VIII. 451	1399
plan	IX	
do 1. V.	27	X
V. 110	137	XI.
VI. 142	279	XII.

BOS


GAZOWNIA

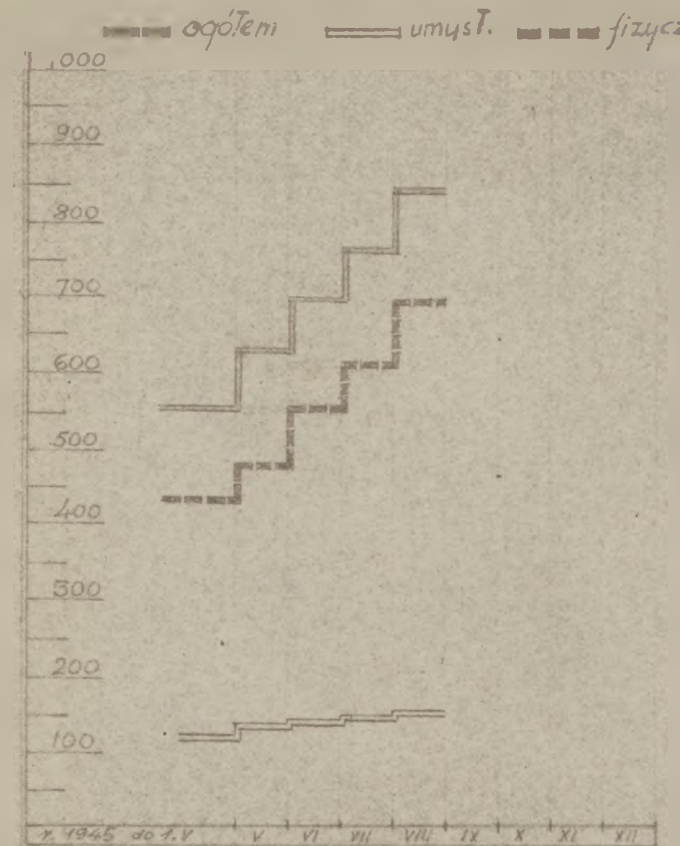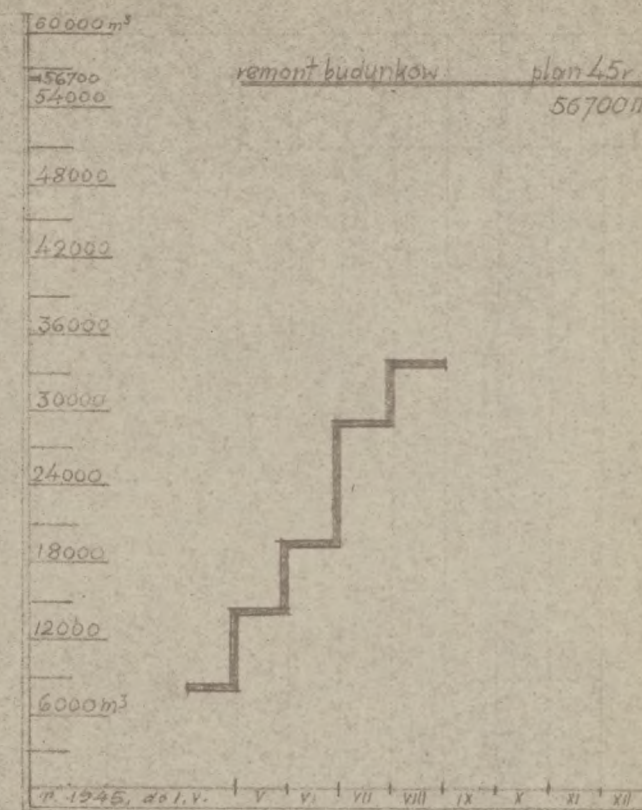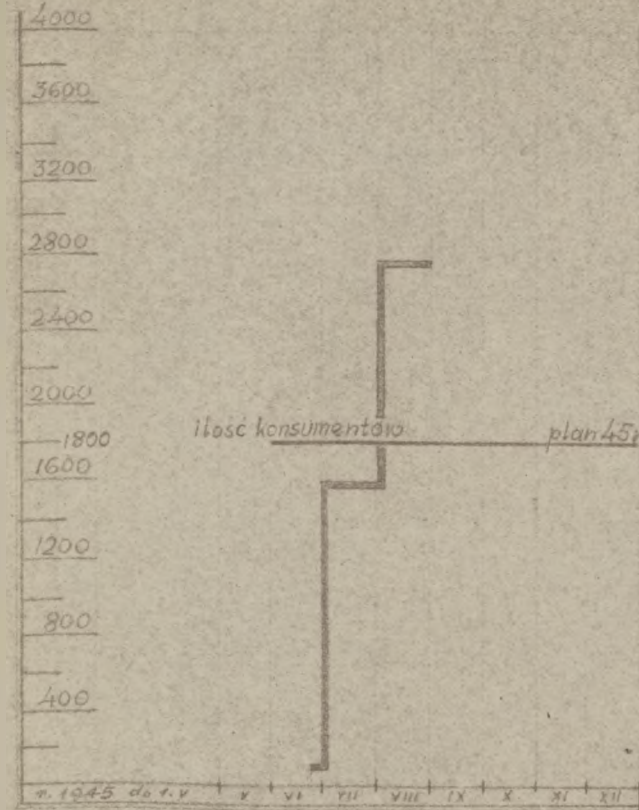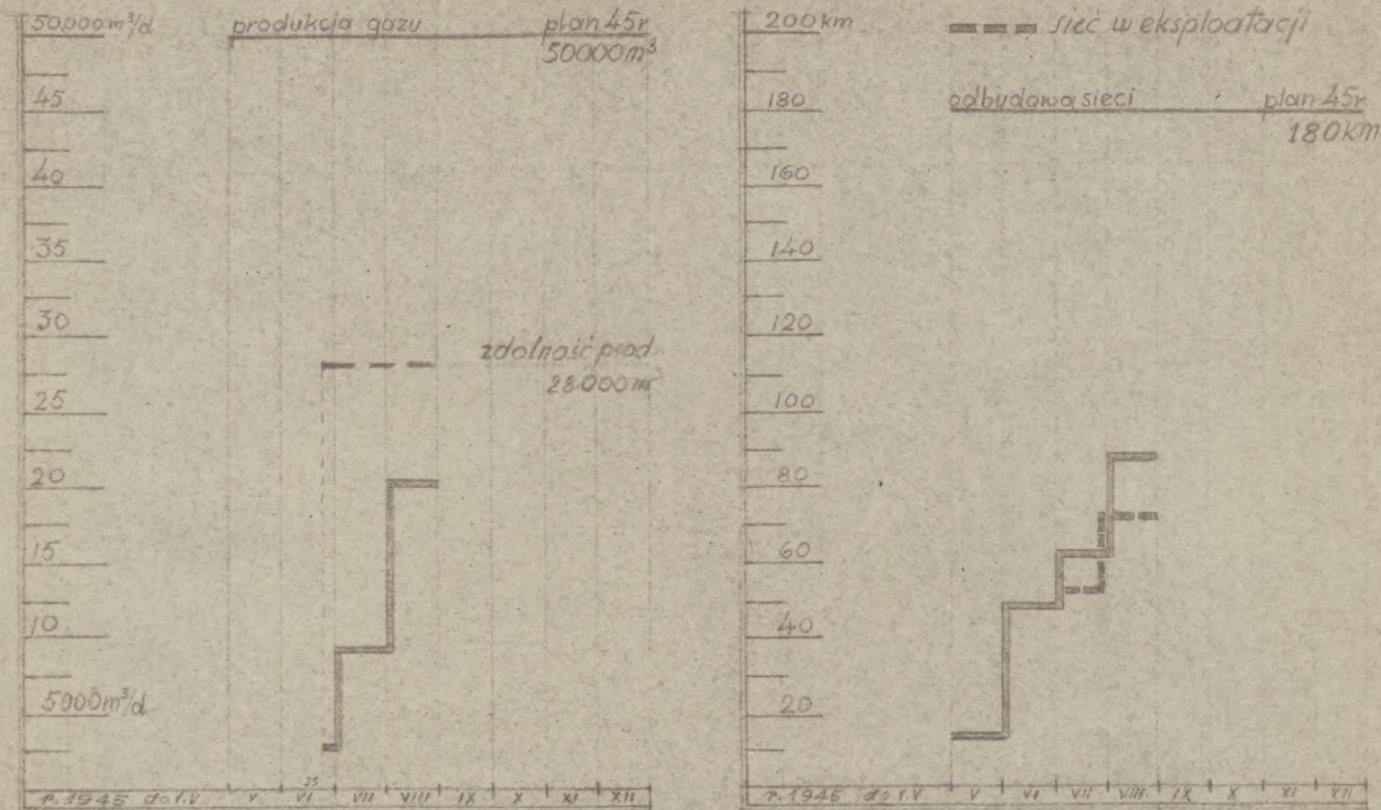

miesiące	Stan zatrudnienia w GAZOWNI średnie miesięczne					
	U.		P.		razem	
	liczba	%	liczba	%	liczba	%
do I.V	121	22	431	78	552	100
V	136	22	485	78	621	"
VI	139	20	554	80	693	"
VII	149	20	613	80	762	"
VIII	153	18	692	82	845	"
IX						
X						
XI						
XII						

BOS.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE.

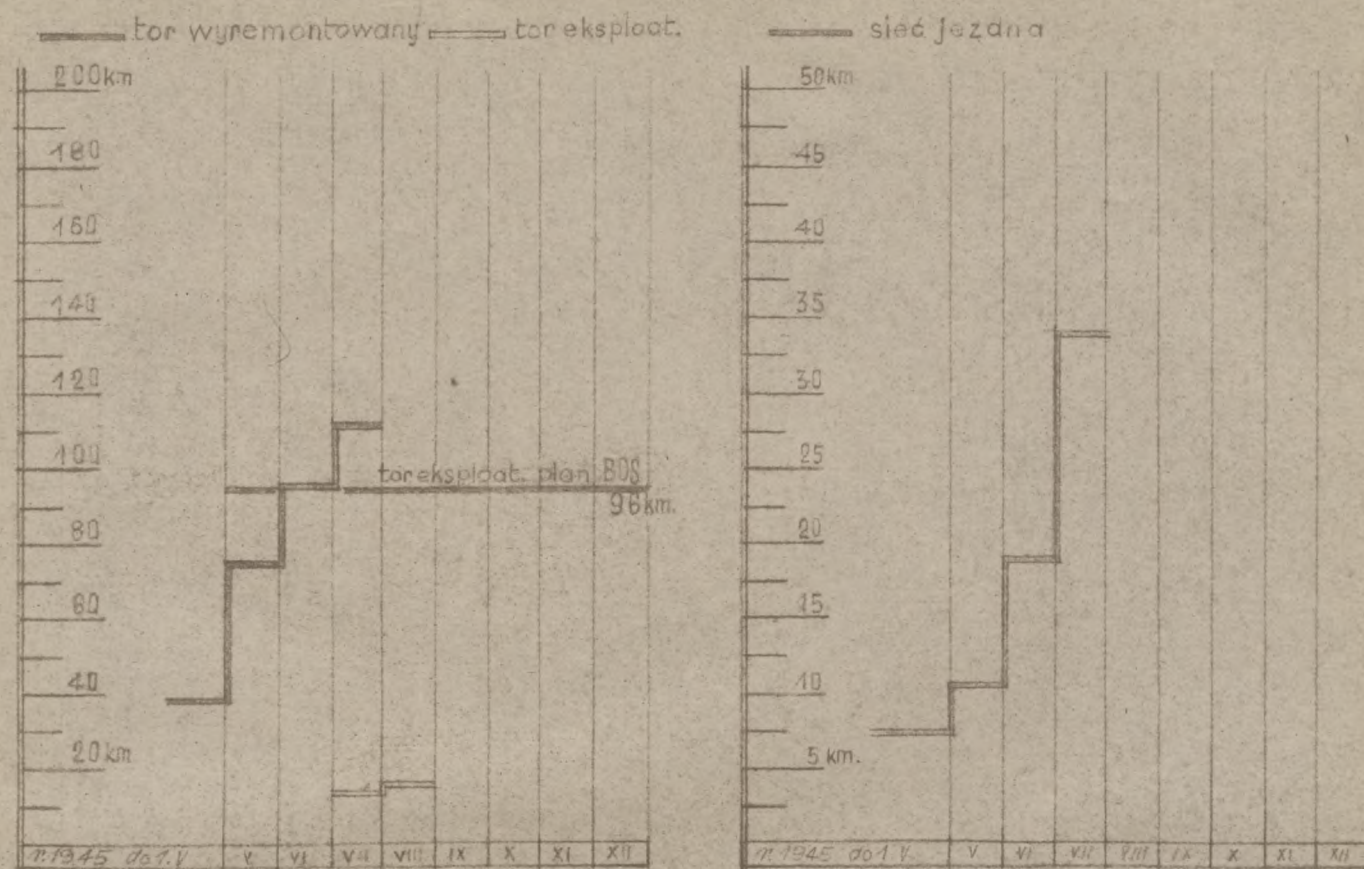

plan BOS na 1945


tor eksploatowany		plan BOS na 1945	
V — 20.0	VI — 29.0	VII — 10	VIII — 15.0
		14.7	19
		96.0 km	
		realizacja planu	
VII — 17.3%			
14.7	VIII 19.8		
		realiz. pl. ogółem	

tor wyremontowany

do 1.V.	39.0	V.	75.0	VI.	98.8	VII.	112.9
1 cm = 10 km.							

sieć jezdną

do 1.V.	7.5	10.5	VI.	19.0	VII.	34.0
---------	-----	------	-----	------	------	------

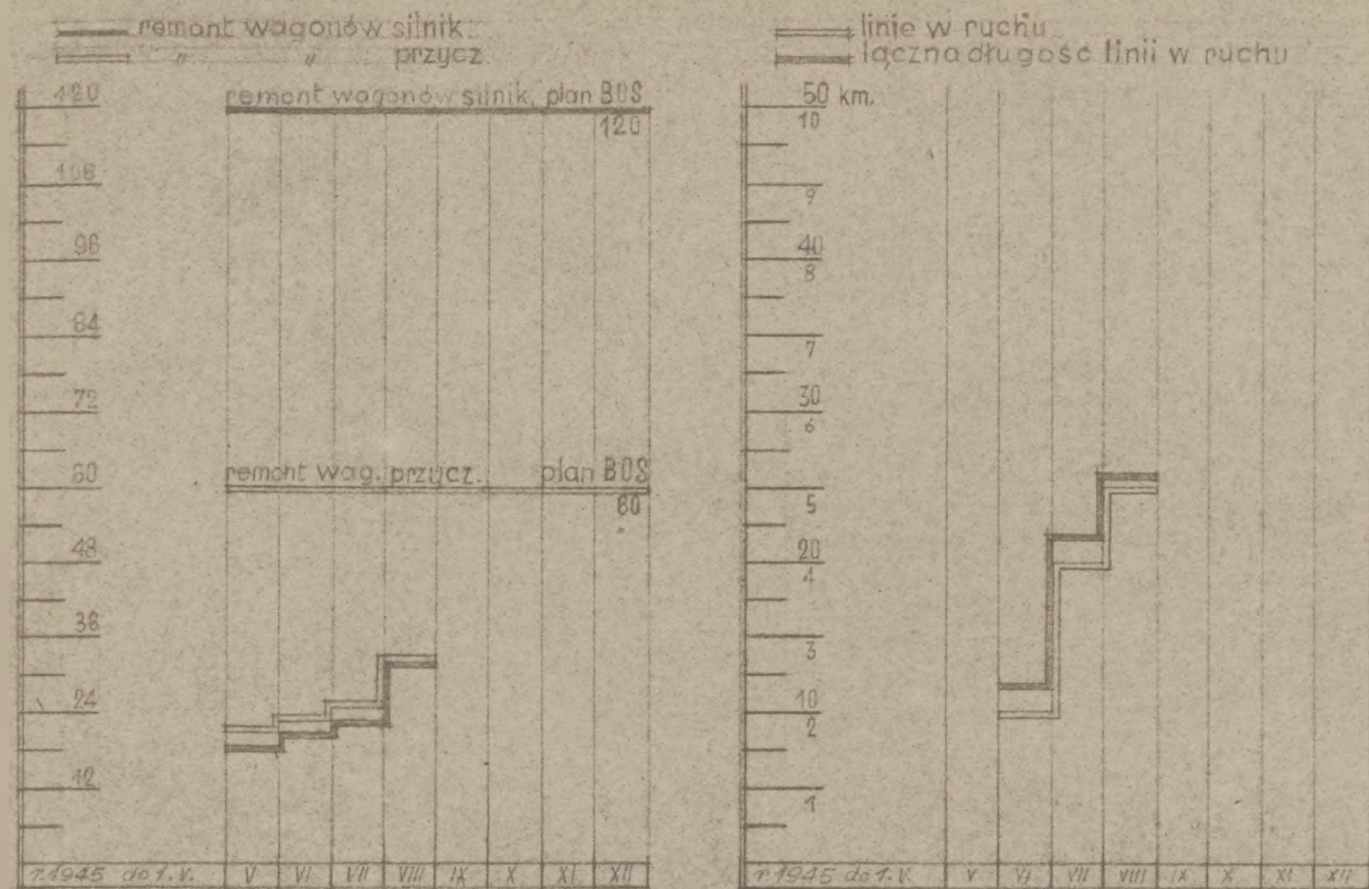

plan BOS na 1945

remont wozów silnikowych		plan BOS na 1945	
V — 10	VI — 30	VII — 40	VIII — 40
19	2	2	9
		420 szt.	
		realizacja planu	
V	15.8%	VIII	28.6%
19	23	32	
		realiz. pl. ogółem	

plan BOS na 1945



remont wozów przyczepnych		plan BOS na 1945	
V — 5	VI — 15	VII — 20	VIII — 20
2	2	7	
		60 szt.	
		realizacja planu	
V	36.8%	VIII	55%
22	24	28	33
		realiz. pl. ogółem	

długość linii w ruchu

VI	11850	VII	22000	VIII	25900 mtp.
11850	40150	38900			


BOS

NAWIERZCHNIE

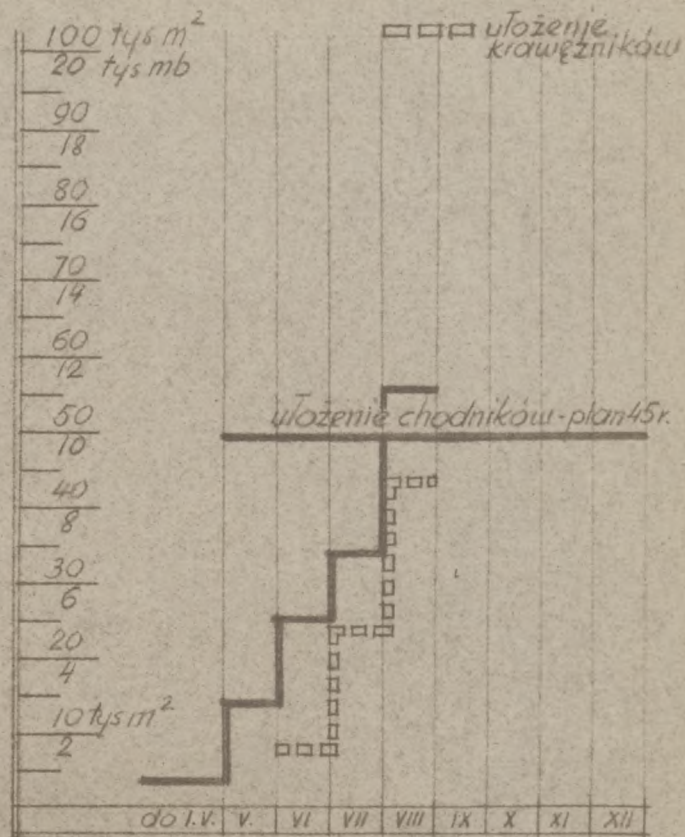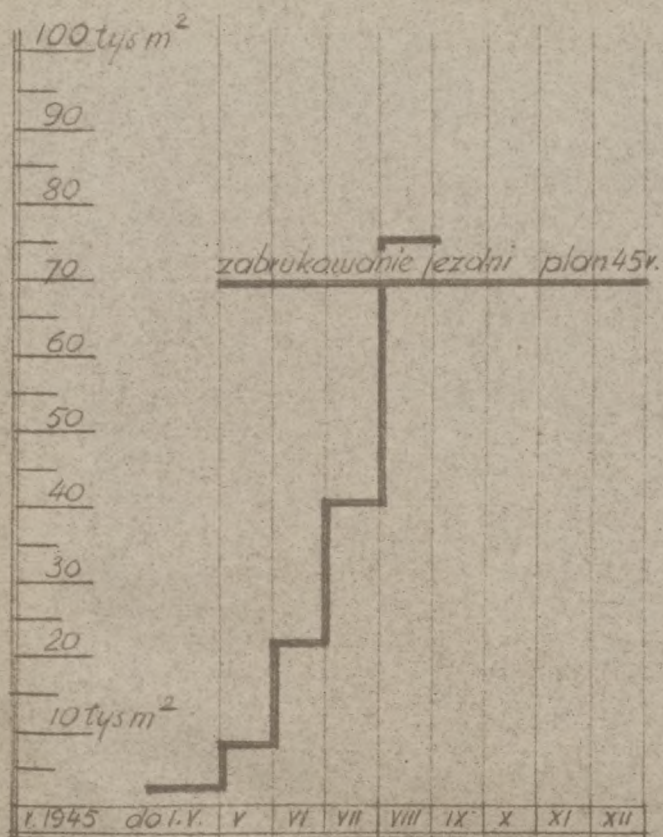


zabrukowanie jezdni w tys. m²

program BOS na 1945r.




ułożenie chodników w tys. m²

program BOS na 1945r.





ułożenie krawężników w mb





1 cm = 100 mb



ODBUDOWA I REMONT NIERUCHOMOŚCI

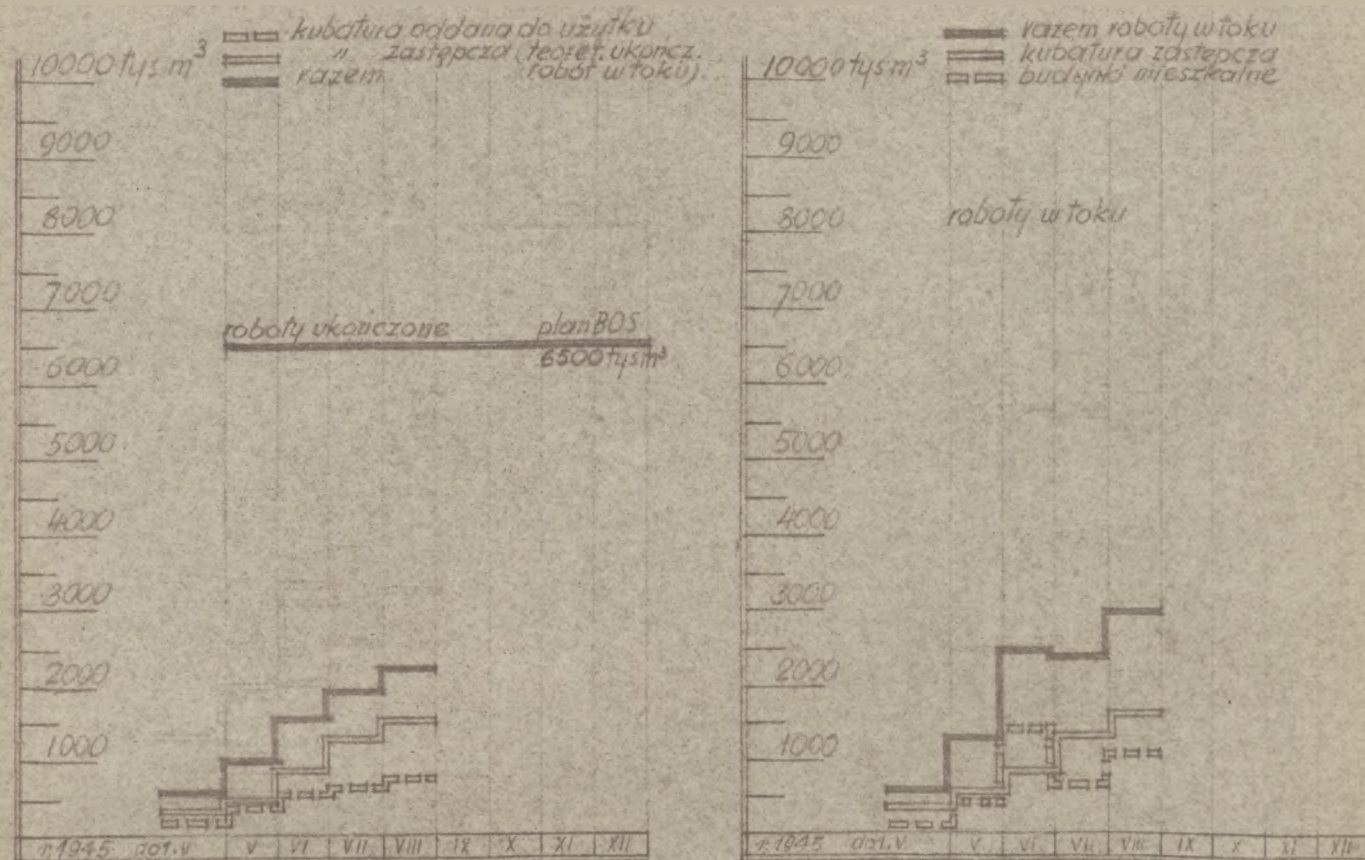

miesiące	kubatura oddana do użytku			kubatura zastępcza (teoretycz. ukończenie robót w toku)		ogółem - kubatura oddana do użytku i kubatura zastępcza		roboty w toku		
	w miesiącu			w mies.	łącznie	w mies.	łącznie	mieszk.	inne	razem
	mieszk.	inne	razem							
IV	43,0	187,0	230,0	230,0	397,1	397,1	627,1	85,0	601,9	686,9
V	59,0	227,0	286,0	516,0	164,5	561,6	450,5	525,0	725,0	1250,0
VI	21,2	69,3	90,5	606,5	348,9	910,5	439,4	1295,4	1098,9	2394,3
VII	23,0	42,2	65,2	671,7	340,9	1251,4	406,1	755,8	1035,7	2391,5
VIII	2,5	37,4	39,9	711,6	332,3	1583,7	372,2	1068,5	1873,4	2946,9
IX										
X										
XI										
XII										

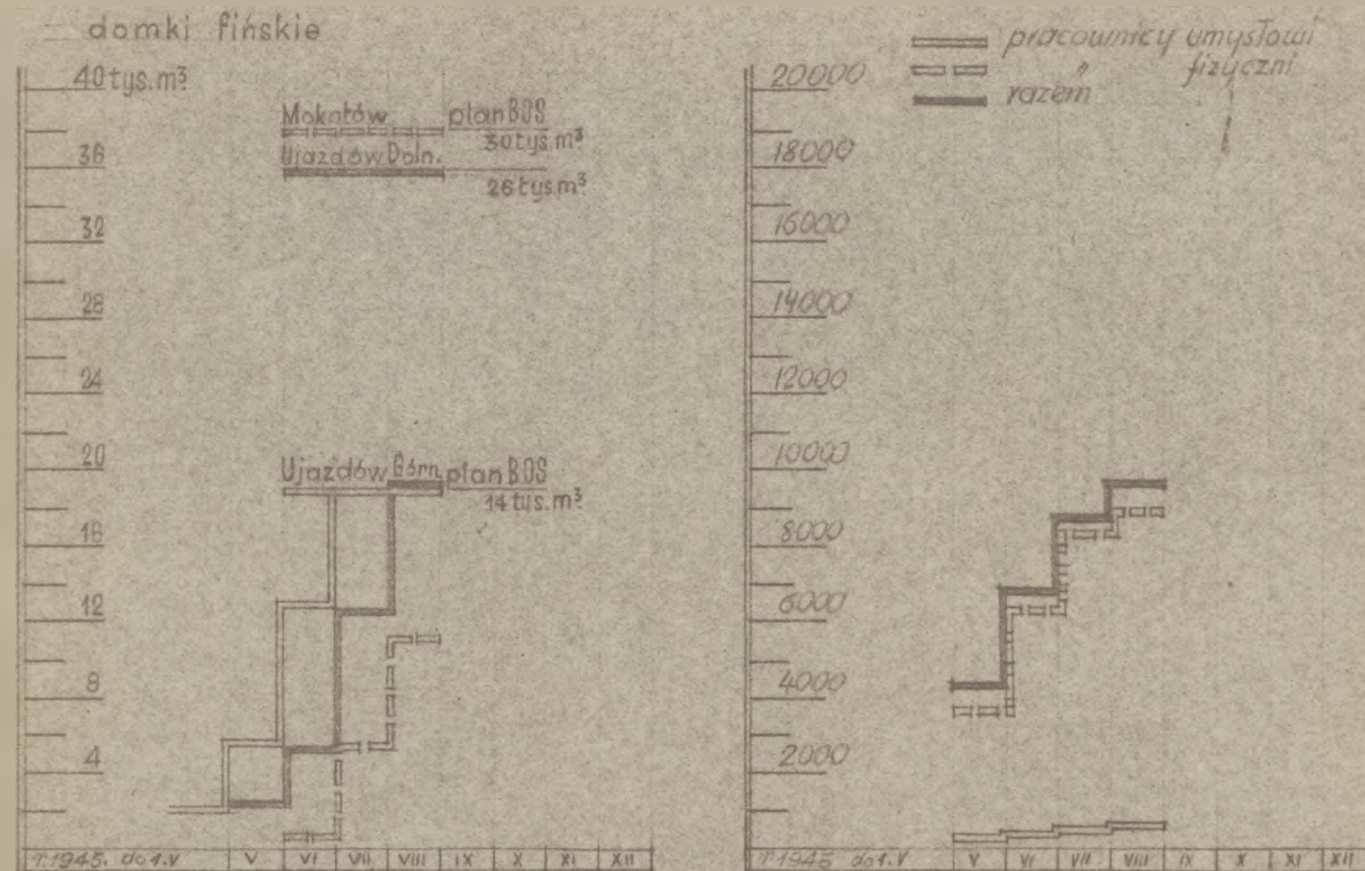

Uwaga: Znaczny spadek "robót w toku" w m. lipcu został spowodowany zmniejszeniem kredytów. Pierwotnie w planie przewidywano remont części mieszkalnej Mokotowa ca 600 tys. m³. Następnie wskutek zmniejszenia kredytów ograniczono plan remontów na Mokotowie do robót najniezbędniejszych. Odpowiednie wyjaśnienie zostało zamieszczone w sprawozdaniu I r. 5.



BOS

ROBOTY ROZBIORKOWO-PORZADKOWE

rozbierki budynków — — — — — wywóz gruzu

stan zatrudnienia

Wynisłowi fizyczni

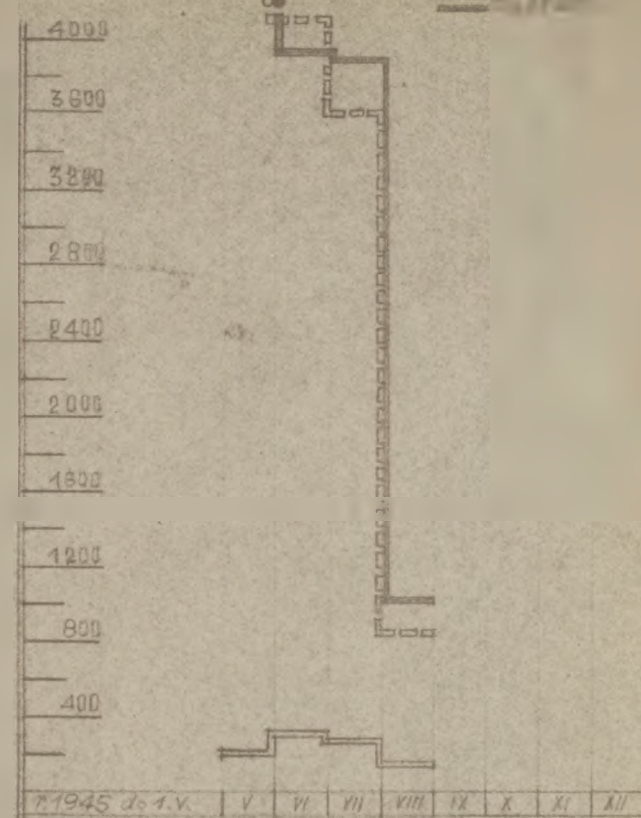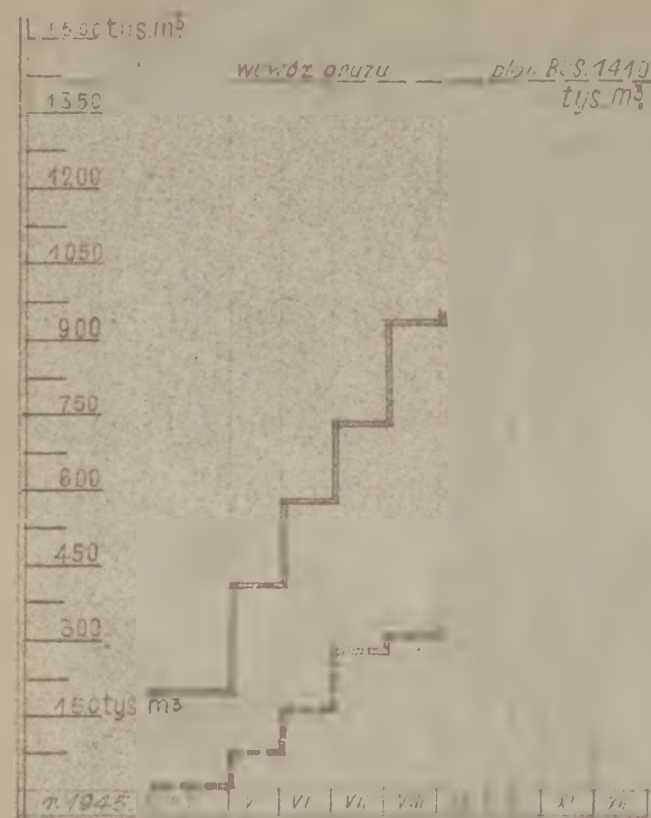


W m. WILKÓZ GÓRU

plan 306 no 1945

VI-120 22° VII-120 22° VIII-120 22°
87°
28.3 50.7 VI-120 VII-120 22°
V-120 72 150 1



1410 tys. zł
realizacja w poszcz. miesi-
cach

W m³. rozdzielona podzielniki

$$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$$


BOS


STAN ZATRUDNIENIA W BOS I SPB w śr. średnich miesięcznych

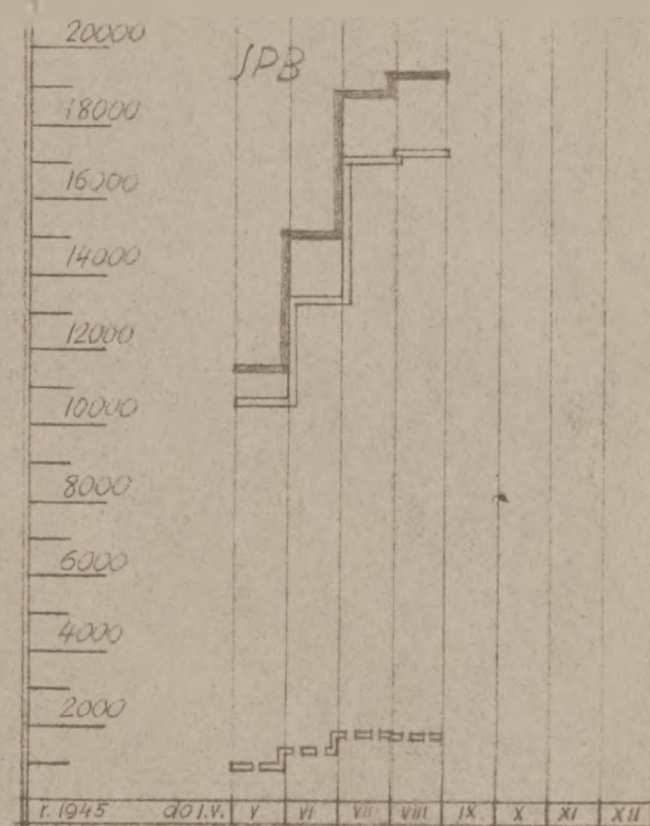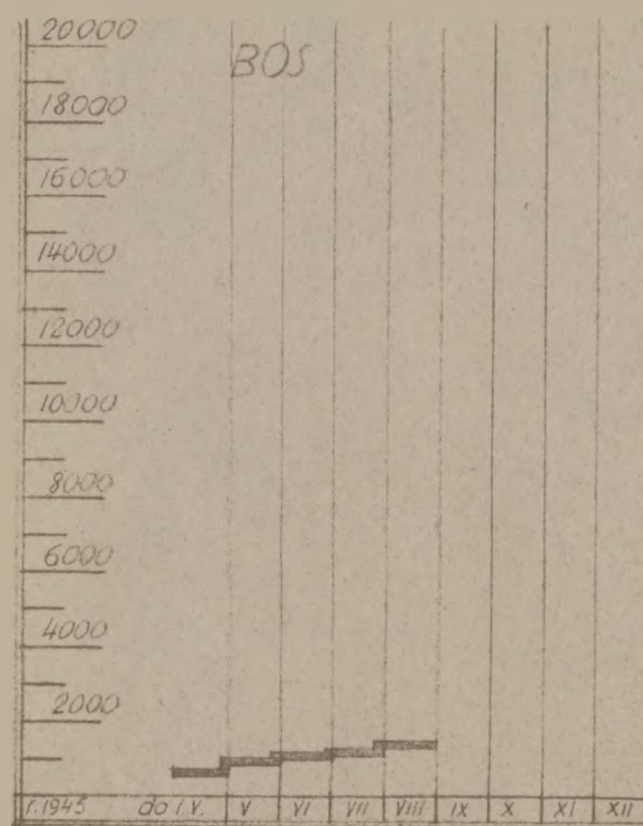

miesiące	stan zatrudnienia w BOS	
	ogółem	
30.IV	708	
31.V	1145	
30.VI	1259	

miesiące	stan zatrudnienia w SPB		
	średnie miesięczne		
	umysłowi	fizyczni	razem
	ilość %	ilość %	ilość %
do I.V.			
V	1055 9	10637 91	11692 100
VI	1734 11,5	13396 88,5	15130 100
VII	1960 10	17033 90	18993 100
VIII	1918 10	17297 90	19215 100
IX			
X			
XI			
XII			

w sierpniu

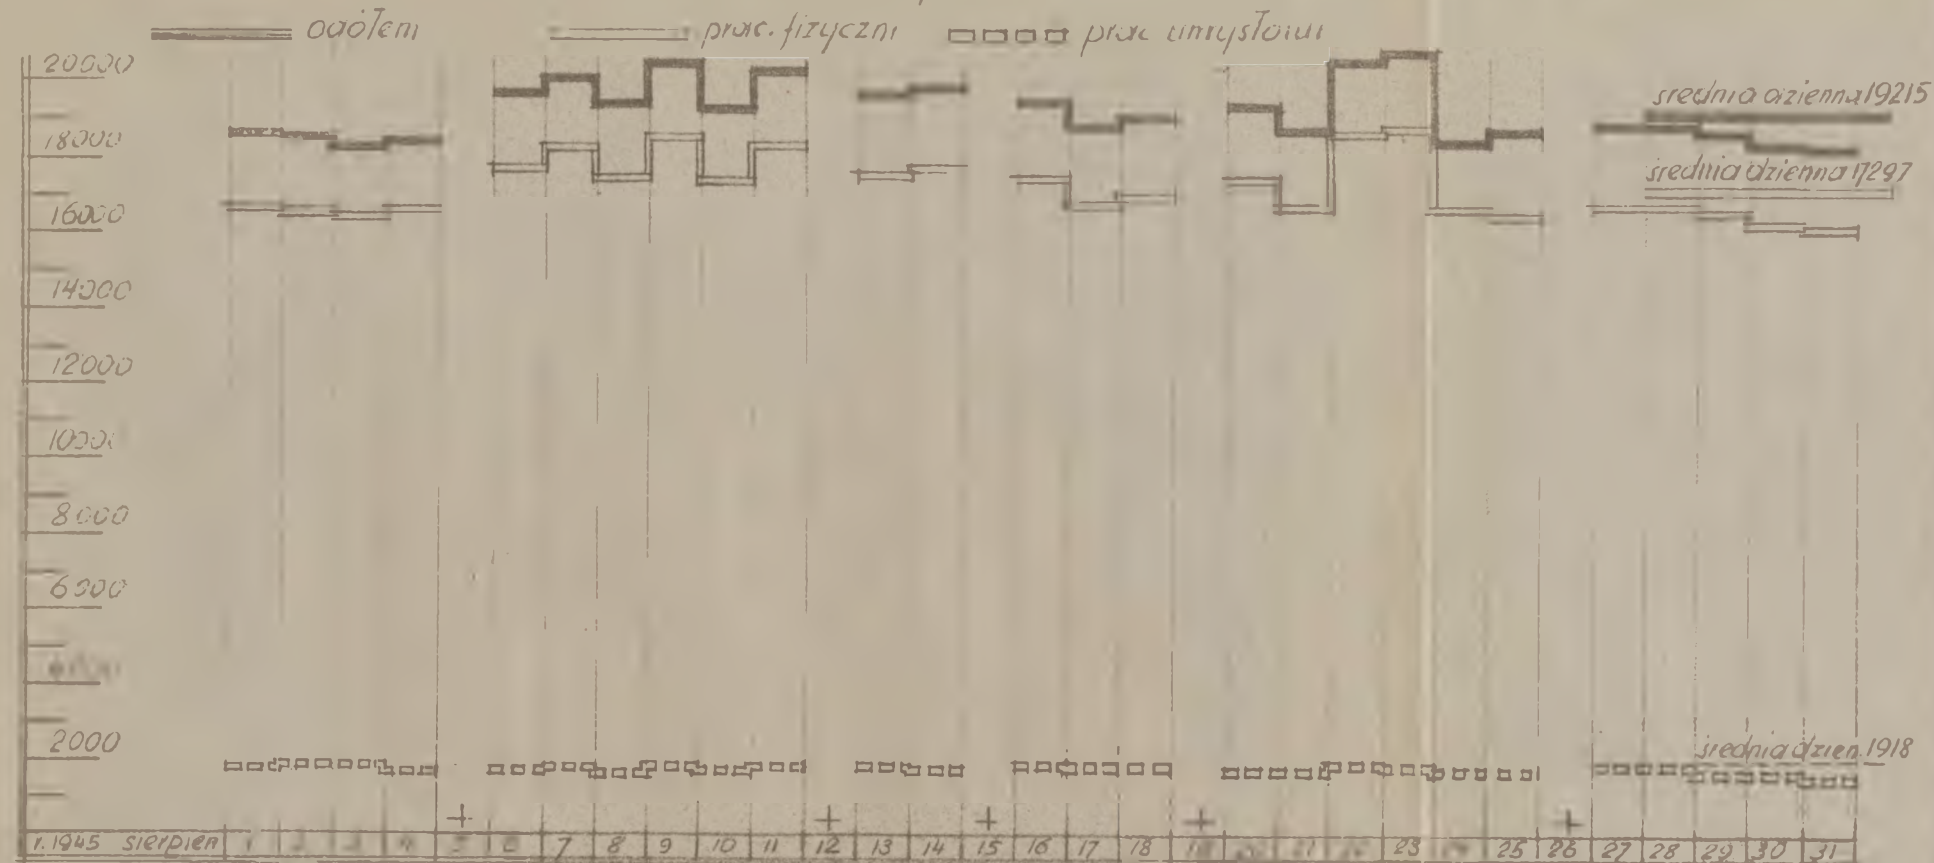

BIBLIOTEKA
STATYSTYCZNA

