


27751




II

II

27751

C D B U D O W A W A R S Z A W Y

Sprawozdanie za czas od 1 - 28.2. 1946 r.



Naczelnik
Wydziału Planowania Gospodarczego
B. O. S.
Belichowski

Sprawozdanie z odbudowy Warszawy uzieli się na trzy zasadnicze działy, a mianowicie:

Dział A. - zawiera krótki przegląd prac wykonanych, podany w formie tabelarycznej.

Dział B. - zawiera prace dotyczące wykonanych i planowanych, a także innych, szczególnie ważniejszych za adminia, mające charakter kluczowy dla odbudowy Warszawy, bądź też wiążące się integralnie z realizacją w najbliższych etapach.-
W sprawozdaniu nie są zamieszczane prace mniejsze oraz cząłności o charakterze adminia-cyjno-nadzorczym.

Dział C. - zawiera wyniki realizacji.
Dział ten ilustruje dynamikę postępu robót w sposób graficzny na snormalizowanych wykresach, które z jednej strony ujmują funkcjonalnie robotę i czas, z drugiej zaś dają porównawczy procentowo-liczbowy obraz z wykonania w zależności od planu.-

Spis rzeczy.

I r e ś ć		Strona	Wykres
I.	Wstęp		
II.	Elektrownia		
III.	Wodociągi i kanalizacja		
IV.	Gazownia		
V.	Miejskie Zakłady Komunikacyjne		
VI.	Budownictwo wodne		
VII.	Roboty mostowe		
VIII.	Remont nawierzchni ulic		
IX.	Odbudowa i remont nieruchomości / remont budynków /		
X.	Roboty rozbiórkowo-porządkowe		
XI.	Stan zatrudnienia w BCS i SPB		
XII.	Most ks. J. Poniałowskiego		
XIII.	Przydziały szkła		
XIV.	Chronika ważniejszych wydarzeń		
XV.	Planowanie i projektowanie		
XVI.	Objaśnienie wykresów		

Dział A. Krótki przegląd prac wykonanych przy
Cdbudowie Warszawy na 1.3.1946 r.

2.

Lp.	T r e ś ć	Jedn.	Warszawa prawo- i lewobrzeżna:				% w s do st nu pr znisz- nian
			Stan przed zniszc.	Do	W lu- tych:	Razem:	
I	Elektrownia						
1.	Moc w kotłach:						
	a/rozporządzalna	KW.	-	32.000	5.000	37.000	-
	b/gwarantowana	KW.	-	23.000	4.000	27.000	-
2.	Moc w turbozespołach:						
	a/rozporządzalna	KW.	95.000	48.000	-7.000	41.000	43
	b/gwarantowana	KW.	95.000	23.000	-2.000	21.000	22
3.	Szczyty obciążeń		-	31.200	1.000	32.200	-
	Produkcja	MWh	-	-	12.753	-	-
5.	Kable zasilające:						
	a/5 KV	Km.	115.00	45.99 x/	1.56	47.55	41
	b/15 KV	Km.	99.00	62.21 x/	5.65	67.86	69
	c/35 KV Szamoty-Centr	Km.	14.00	10.50	1.40	11.90	85
6.	Kable rozdzielcze:						
	a/ 5 KV	Km.	550.00	211.68 x/	8.27	219.95	40
	b/ N N	Km.	750.00	258.48 x/	16.59	275.07	37
7.	Stacje transformat.	szt.	1620	639	27	666	41
8.	Remont budynków	%	100	89	1	90	90
9.	Remont podstacji	%	100	96	-	96	96
10.	Transform.włączeniowe	szt.	-	289	49	338	-
11.	Lampy uliczne	szt.	7000	974	150	1124	16
12.	Posesje pod napięciem	szt.	-	2929	210	3139	-
	/Warszawa lewobrzeżna/						
13.	Ilość abonentów:						
	a/ ogółem	szt.	-	66873	-	-	-
	b/-wa lewobrzeżna	szt.	-	29550	-	-	-
14.	Stan zatrudnienia:						
	a/prac.umysłowi	prac	-	750	54	804	-
	b/prac.fizyczni	prac	-	1917	11	1906	-
	c/prac.razem	prac	-	2667	43	2710	-
II	Wodociągi i Kanalizacja.						
15.	wydatek wody:						
	a/ maksymalny	tys. m ³ /d	140.00	41.79	2.10	43.89	31
	b/ średni	tys. m ³ /d	100.00	40.40	0.61	41.01	41
16.	Wydajność Filtrów	" "	300.00	94.00	-	94.00	31
17.	Nawodnienie sieci wod.	Km.	630.00	365.93	40.00	100.00	67
18.	Studnie artezyjskie	szt.	-	7	21.62	337.55	62
19.	Przyłączenie nieruch.	szt.	13.928	4.980	-	7	-
20.	Zdroje	szt.	-	11	300	5.280	38 xx/
	Kontrola tras kanałów	Km.	357.00	218.77	60.71	279.48	-
	Czyszczenie obiektów						
	kanałowych	szt.	-	1374	12	1386	-
24.	Czyszczenie kanałów						
	murowanych	Km.	-	-	2.63	-	-
	przepłukanie kanałów						
	rurowych	Km.	-	-	1.55	-	-

		warszawa prawo- i lewobrzeżna:				% w st. do stanu przed zniszcze- niem:
Lp.	I r e s c:	Jedn.	Stan przed zniszcze-	Do 1.2.46r.	y k o n a n o: lu- tym. Razem:	
30	Stan zatrudnienia:					
	a/ prac.umysłowi	prac.	-	324	7	331
	b/ prac.fizyczni	prac.	-	1678	1	1681
	c/ prac.razem	prac.	-	2002	10	2012
	Gazownia.					

	Produkcja gazu	t	-	26.30	1.29	27.59
	Żelazo produkcyjna		200.00	40.00	-	40.00
	Odbudowa sieci	Km.	708.44	130.00	2.93	132.93
	Sieć w eksploatacji	Km.	708.44	130.00	2.93	132.93
31	Remont urządzeń fabrycz.					
	a/ fabr.gazu	%	100	65	-	66
	b/ fabr.chemiczna	%	100	89	-	89
	Remont budynków	%	100	82	-	82
32	Przyłącz. nieruchomości	szt.	-	850	147	997
34	Ilość konsumentów		116.033	7717	906	8623
35	Stan zatrudnienia:					
	a/ prac.umysłowi	prac.	-	156	-	158
	b/ prac.fizyczni	prac.	-	712	40	752
	c/ prac.razem	prac.	-	868	10	880
	IV M.Z.K.					

36	Tor wyremontowany	kmpt.	256.41	172.0	0.5	172.5
37	Tor w eksploatacji	kmpt.	224.49	39.6	-	39.6
38	Sieć jezdna	Km.	254.73	96.3	4.9	101.2
	Kable podziemne	Km.	227.76	85.5	26.1	111.6
	Wozy gotowe do ruchu:					
	a/ silnikowe	szt.	398	28	8	74
	b/ przyczepne	szt.	324	57	1	58
	Ilość wagonów w ruchu:					
	a/ silnikowych	szt.	362	30	2	37
	b/ przyczepnych	szt.	300	59	4	53
	Ilość linii w ruchu	szt.	39	13	-	13
43	Łączna długość linii w ruchu	Km.	407.12	58.3	-	58.3
44	Trolleybusy:					
	a/ ilość linii	szt.	-	2	-	2
	b/ linie w eksploatac.	Km.	-	5.3	-	5.3
	c/ ilość wozów w ruchu	szt.	-	8	2	10
	V Budownictwo wodne.					

	Roboty ziemne	tyś.m.	-	137.40	0.93	138.33
	Konserwacja kanałów:					
	a/ krytych	Km.	-	97.52	16.72	114.24
	b/ otwartych		-	51.15	3.52	54.67
	Roboty mostowe.					

	Most im.Ks.J.Poniatows					
	a/ odbudowa mostu					

Do chwili rozpoczęcia się ruchu lodów. wykorzystując pokrywę pokrywę lodową, przetransportowano na brzeg materiał z rozebranych rusztowań oraz zasypywano gruzem podmyty filar N.2. Transport odbywał się przy pomocy dwóch linii wąskotorowej kolejki. 9 lutego rozpoczął się pochód lodów - kolejkę rozebrano. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące roboty:

1. Opuszczenie kranu portalowego na wieże, dla zabezpieczenia przed lodochoodem i demontaż kranu.
2. Wywózka gruzu i licówki z przęsła 4-go.
3. Kucie bruzd w filarach N.2 i N.6.
4. Rozbiórka rusztowań oraz wieży 1 i 2 z przęsła trzeciego, oraz zniszczonego pomostu.
5. Regulacja przęsła drugiego.
6. Montaż konstrukcji nadłukowej.
7. Wyciąganie pali z przęsła 1-go.
8. Transport elementów kranu oraz drzewa z przęsła.
9. Zabezpieczenie kranu „olffa” przed lodochoodem.
10. Stemplowanie zwalonych łuków i odpalanie końców.
11. Ułożenie przewodów powietrznych i elektrycznych zniszczonych przez lodochód.
12. Cięcie wraków.
13. Transport konstrukcji nadłukowej 4-go przęsła na górę.
14. Montaż chodnika dla próbnego obciążenia.
15. Budowa rusztowań dla remontu uszkodzonych starych przęseł.

Wykonano 70% montażu konstrukcji nadłukowej 2-go przęsła. Odebrano z Huty "Pokój" 4-y łuki trzeciego przęsła oraz 83 tony niecek jezani i konstrukcji wspornikowej chodników.

Sprawozdanie z rozdziału szkła, dokonanego przez B.O.S.

w lutym 1946 roku

Pozostało na

1.2.1946 r.

66.434 m²

Wydano zleceń:

szpitale	4.676	m ²
szkoły i inst.nauk.	19.079	"
urzędy państw.i kom.	4.015	"
inst.społ.samorząd.	556	"
inst.wyższ.użyteczn.		"
i użyteczn.publicznej	390	"
P.U.R. i P.C.K.	95	"
prac.państw.,sam.społ.	10.584	"
przeds.zagran.	420	"
prywatni	5.859	"

45.684 m²

Pozostaje rezerwa

20.750 "

66.434 m²

66.434 m²

C

Kronika ważniejszych wydarzeń z dziedziny organizacyjno-prawnej i technicznej w związku z odbudową Warszawy

1 9 4 6 rok.

ccc

-
- | | |
|---------|---|
| Styczeń | 4. Pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Odbudowy m.st. Warszawy; powołanie Generalnego Sekretarza i Komitetu Propagandy Odbudowy Warszawy; uchwalenie szeregu wniosków w sprawie zapewnienia źródeł finansowania odbudowy. |
| Styczeń | 5. Uruchomienie komunikacji trolleybusowej. |
| Styczeń | 13. Wyjazd do Londynu polskiej delegacji propagandowej. Cel wyjazdu: 1/ zorganizowanie wystawy "Warszawa Oskarża" oraz szeregu propagandowych odczytów, 2/ zasięgnięcie opinii zagranicznych specjalistów w sprawie metod pracy i wytycznych przyjętych przy opracowywaniu planu Odbudowy Warszawy. |
| Styczeń | Nawiązanie kontaktu z Rektoratami wyższych uczelni i zaprojektowanie powołania do życia przy poszczególnych uczelniach Zakładów Badań Zagadnień Warszawy na wzór Instytutu utworzonego przy Uniwersytecie Warszawskim. |
| Styczeń | Utworzenie przy Kierownictwie B.C.S. Rady Naukowej jako organu doradczego. W skład Rady wchodzi wybitni uczeni specjaliści. |
| Luty | 1. Wyłożenie na widok publiczny szkicowego projektu odbudowy. W ciągu lutego przeprowadzono szereg konferencji z władzami i przedstawicielami społeczeństwa, celem uzyskania ich opinii. |
| Luty | 2. Powstanie wydawnictwa "Kronika Odbudowy Warszawy" przeznaczone wyłącznie dla Polonii Zagranicznej. |
| Luty | 13. Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw N.3/46 Dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o publiczne gospodarce lokalami i kontroli najmu w większych miastach Polski. |

Planowanie i projektowanie.a/ Prace inwentaryzacyjne.

1. Ukończono inwentaryzację zniszczeń urządzeń wodociągo-wo-kanalizacyjnych, tramwajów i autobusów.

2. Przeprowadzono korektę inwentaryzacji terenów niezabudowanych na Żeraniu na podstawie fotoszkieł.

3. Opracowano w zeszytach przygotowywanego wydawnictwa całokształt zniszczeń Warszawy w zakresie zdrowia i opieki społecznej oraz przemysłu, handlu i finansów.

4. Opracowano plan przewidywanych mas gruzów Warszawy lewobrzeżnej w skali 1:10000 oraz plan gruzu na ulicach w skali 1:20000.

5. Wykreślono aktualną na 1.1.40 r. sieć urządzeń miejskich na planach Warszawy w skali 1:50000.

adnienia planowości.

1. Opracowano zarys planu gospodarczo-finansowego na drugi, trzeci i czwarty kwartał 1940 roku.

c/ adnienia demograficzne.

1. Obliczono przeciętną gęstość ludności dla kolonii, osiedla i całego miasta.

2. Obliczono powierzchnię zużytkowania terenów budowlanych i wolnych przewidzianych w ogólnym planie zabudowania.

d/ Zadania inżynierskie.

1. Ukończono projekt drogowy Kuranowa /przebieg ulic/.

2. Ułożono tablice pomocnicze do obliczania konstrukcji żelbetowych.

3. Opracowano projekt przebudowy dawnej hali kurtu i ostygalni na chłodnię w Rzeźni Miejskiej.

4. Zaprojektowano poprawę odwodnienia części terenów domków fińskich przy ul. Wawelskiej oraz trasy ścieżek gruntowych.

5. Przeprowadzono obliczenia statyczne dla całego szeregu projektowanych lub remontowanych budynków.

e/ Zaznaczenia komunikacyjne.

- Opracowano plan schematyczny sieci kolejowej P.K.P. w Rejonie Kolejowym Warszawskim w skali 1:20000.

Ukończono studium układu dróg kolejowych, kołowych i pieszych dla dzielnic transportowo-przemysłowej na Żeraniu i dzielnic mieszkaniowych na Nowym Bródnie i Polcowie.

f/ Zaznaczenia zieleni.

- Zebrano materiały i opracowano wnioski w sprawie przekazania majątków ziemskich w promieniu 30 km. od Warszawy Zarządowi Miejskiemu na własność.

Opracowano graficznie plansze: schemat ogrodu działkowego o. cmentarz poległych w powstaniu, otoczenie ogrodowe domków fińskich na Mokotowie i Ujazdowie Polnym.

g/ Zaznaczenia prawne.

- Opracowano opinie w sprawie składane o przez Ministerstwo Budowy projektu prawa budowlanego.

h/ Zaznaczenia urbanistyczne.

Opracowano w skali 1:2500 projekty zabudowy Wierzbna - części adaptowanej i nowego osiedla.

Ukończono obliczanie kubatur i gęstości zaludnienia dla dzielnic Mokotów.

Naszkicowano w skali 1:2500 dzielnice mieszkaniowe Saskiej Kępy i osiedla na Grochowie oraz w pierwszej wersji obszar terenów wystawowych.

- Opracowano projekty zabudowy dzielnicy uniwersyteckiej w skalach 1:5000 / 1-ie opracowanie/ i 1:2500.

Wykończono szkicowy projekt zabudowy Powiśla śródkowego w skali 1:2500.

Opracowano w skali 1:2500 alternatywy zabudowy dzielnicy położonej wzdłuż ul. Emilii Plater / teren ograniczony ulicami Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, Piłsudskiego, Koszykowa, Lindley'a/.

Opracowano w skali 1:2500 ogólny program wyburzeń w śródmieściu.

Naszkicowano projekt rozbudowy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 1-szy etap realizacji w skali 1:2500.

- Opracowano projekt rozbudowy Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, Tworca Zachodniego,

placu Narutowicza oraz części spożywczej iaczodnie,
działnicy Zaopatrzenia /sytuacja zespołu ziarno-mąka/.

10. Przygotowano projekty szkicowe z uwzględnieniem zasad głównych założeń plastycznych w skali 1:10.000 dla dzielnic transportowo-przemysłowej Żerań i mieszkaniowych Nowe Brodno i Felcowizna.
11. Zakończono próbne przygotowywanie typowej legendy dla szczegółowego planu zabudowania miasta.
12. Opracowano graficznie szereg plansz uzupełniających, a mianowicie: ogólne układy dzielnicy i urbanów w skali 1:10000 na wystawę, jak również plan załączników przyjętych przez Państwo w Chr. Warszawskim; plan miejscowości, których dotyczył dekrety o gospodarce mieszkaniowej i t.p. w skali 1:100000.

i/ a. adnienia architektoniczne.

1. Opracowano program szpitala o 1000 łóżek z ambulatorium i pracowniami w trzech odmianach: a/ oddziałem pediatrycznym i b/ oddziałem skórno-wenerycznym.
- Opracowano program typowych domów dla urbanowa: młodzieżowego, domu kultury i domu rozrywkowego.
- Wykonano szkice typowych budynków mieszkalnych dla dzielnicy Koło w 3 rodzajach: galeriowy, korytarzowy i grupowy.
- Ukończono szkicowy projekt szkoły powszechnej 8-klasowej równoległej.
5. Opracowano szkic kompozycyjny projektu ośrodka teatralnego przy Teatrze Polskim /dom artystów, szkoła teatralna i t.p./
6. Ukończono szkic projektu typowego przystanku podziemnej, szybkiej kolei miejskiej.
7. Naszkicowano plan sytuacyjny dzielnicy dyplomatycznej /ul. Stalina i przyległe przecznice/.
8. Ukończono studium zabudowy bloku na terenie którego znajduje się Bank Towarzystw Spółdzielczych.

j/ Ukończono kosztorysy:

T r e ś ć:		1946r		R a z e m:	
		w tys.		Ilość m. w tys.	
Remontowe	412	4656,7	18	64,6	430
Inst.w.k.i. oraz	742	6078,1	1	107,1	754
Inst.elektrycz.	451	4252,0	27	91,0	478
					4721,3
					1130,6
					4343,0

Dokumentarne prace w zakresie architektury zabytkowej:

P r e s e:	Dotokr. sprawozd.	w luty 1946 r.	a z e m
Pomiary budynków zabytko- wych: wykreślenie planów	54	-	56
osztorysy budynków za- bytkowych	163	14	177
Ukończone roboty zabezpie- czeniowe	41	1 xx/	43

x/ Muzeum Przemysłu i Rolnictwa i "Zachęta".

xx/ Ukończono zabezpieczanie gmachu Tow. Kredytowego Ziemskie-
go na placu Małachowskiego.

1. Ukończono I studium "Osł Saskiej" łącznie z przylegają-
cymi działkami.

2. Opracowano na zasadzie szczegółowego planu jurydyk plan
ogólny na arkuszu zbiorczym.

3. Zakończono projekty odbudowy fasad budynków na Krakowskim
Przedmieściu /na odcinku od pałacu Zamoyskich do ul.
Traugutta; od Ossolińskich do Miodowej; od Szpitala Sw.
Rocha do kościoła Wizytok i od kościoła Karmelitów do pl.
Zamkowego/ i Nowym Świecie / na odcinkach Warecka - Pałac
Zamoyskich, Smolna - ul. Pierackiego i Ordynacka - Pałac
Staszica/.

Remont budynków w tys.m.
w lutym 1946 r.


T r e ś ć:	Szkół:		Szpitale:		Bud. mieszk.:		I n n e:		R a z e m:	
	kub.:	%zaaw:	kub.:	%zaaw:	kub.:	%zaaw:	kub.:	%zaaw:	kub.:	%zaaw:
Roboty w toku w lutym 1946 roku	589	75	209	52	504	74	1620	82	2922	77
Roboty wstrzymane	207	70	175	20	363	64	-	-	745	55
Razem roboty rozpoczęte i nieukończone	796	73	384	37	367	69	1620	82	3667	73
Ukończono	412	-	146	-	535	-	1406	-	2499	-
Kubatura zastępcza x/ robót w toku	441	-	108	-	372	-	1328	-	2249	-
robót wstrzymanych	145	-	35	-	232	-	-	-	412	-
Ogółem ukończono robót /roboty ukończone i ku- batura zastępcza/	998	-	289	-	1139	-	2734	-	5160	-
Razem roboty ukończone, wstrzymane i w toku	1208	-	530	-	1402	-	3026	-	6166	-

x/ Teoretycznie wykonana kubatura robót w toku.


BOS

ELEKTROWNIA


— moc rozporządzalna
— gwarantowana

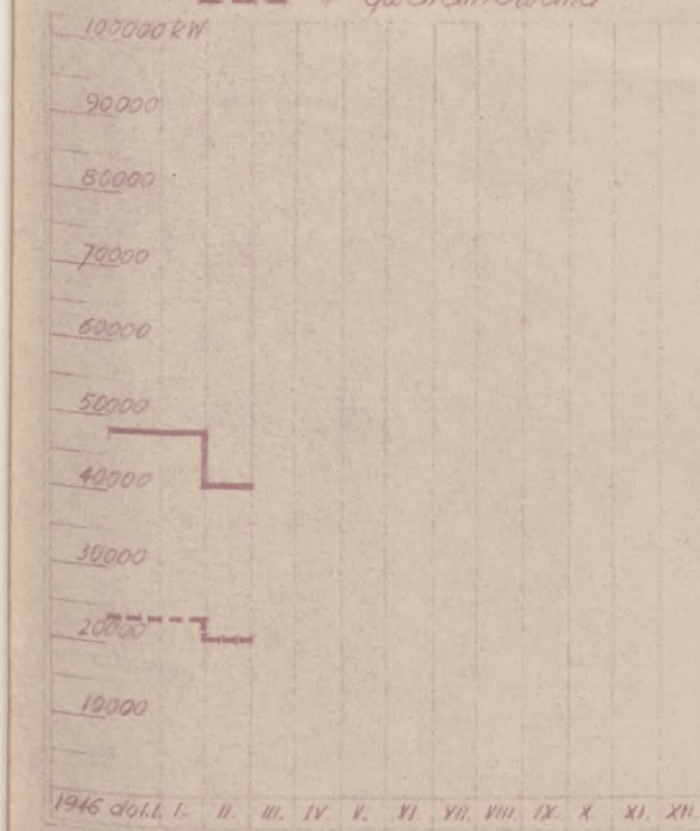


— kable zasil. 5 kV
— " " 15 "

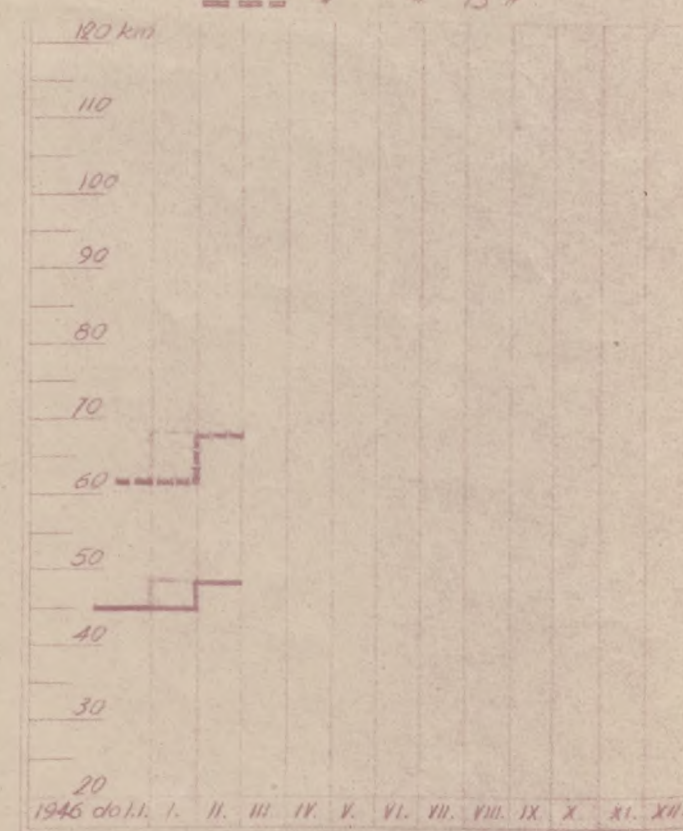


— kable zasil. 35 kV Szramoty

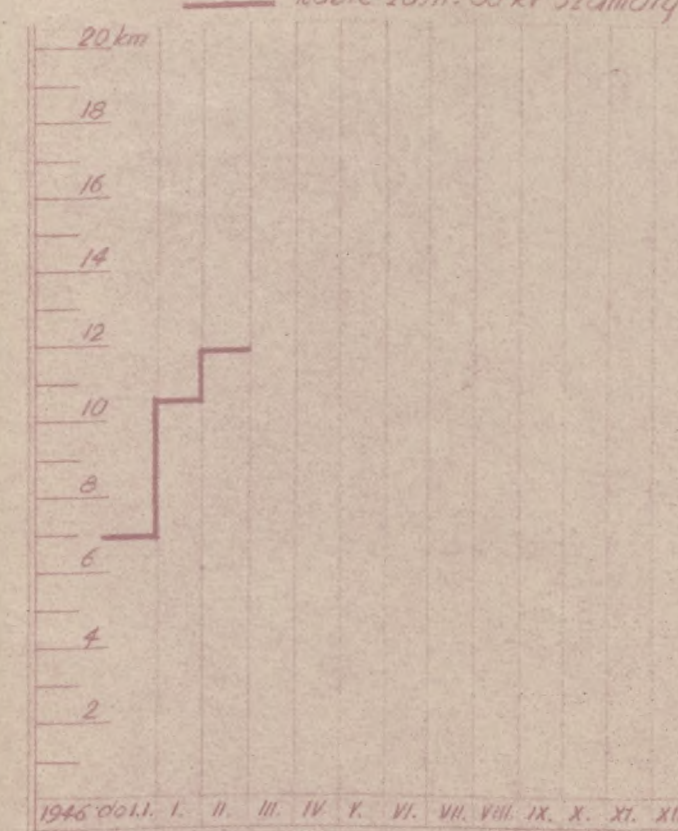


— kable rozd. 5 kV
— " " NN

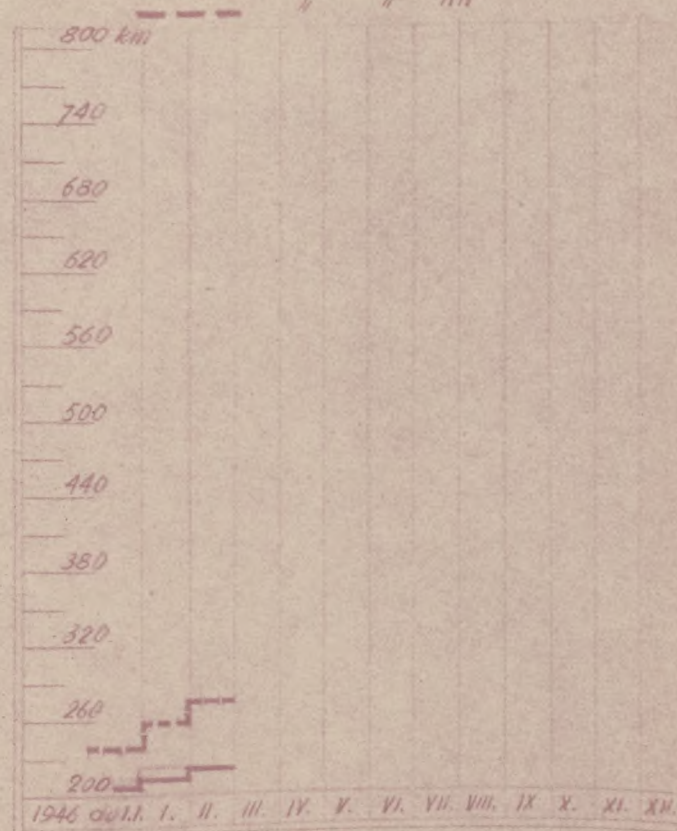


— zapalono lamp ulicznych
— stacje transformacyjne

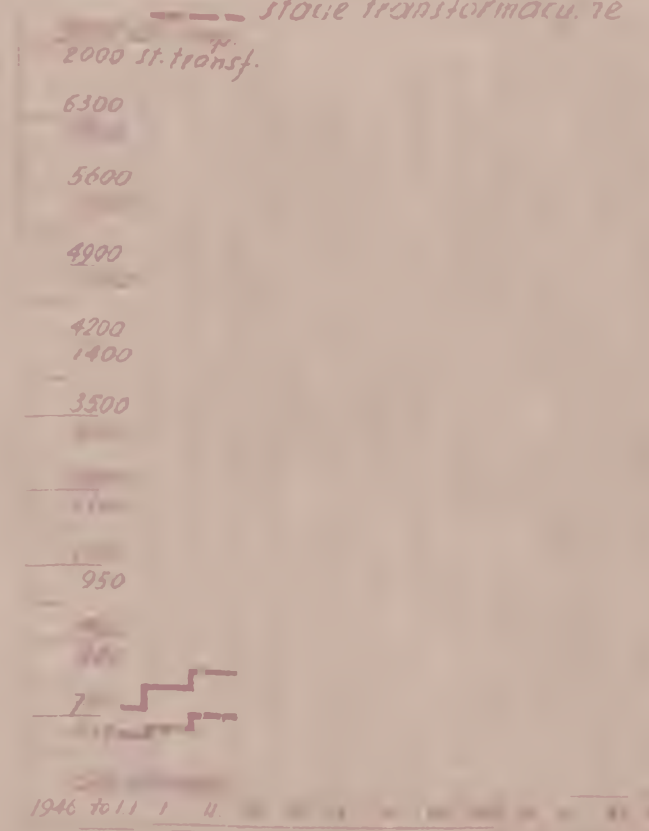


— remont budynków

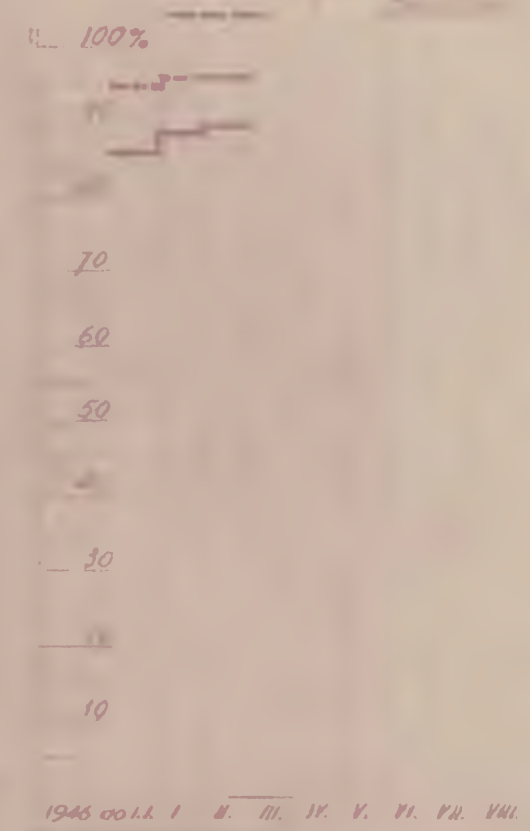


— ilość abonentów - Warszawa lew.
— posesje pod napięciem " "

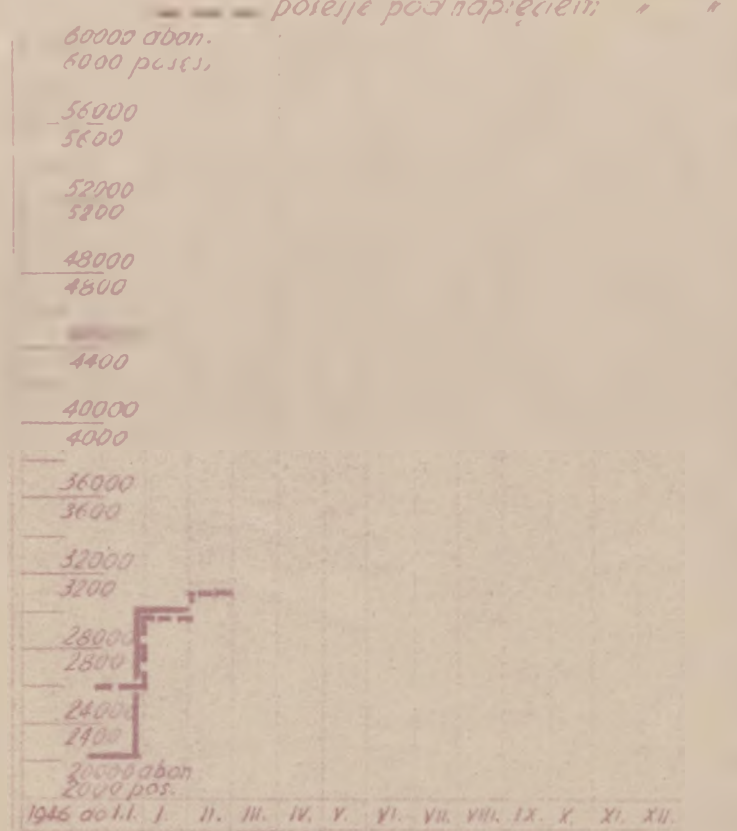


— prac. na Ter.
— " fizj. z
— " teren

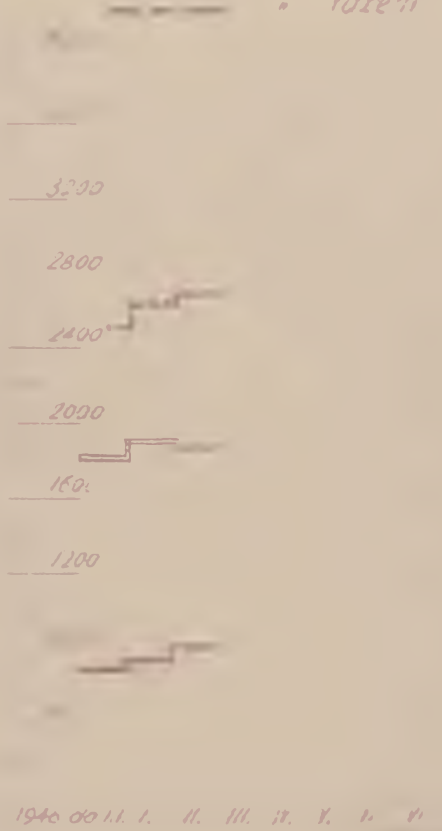


moc rozporządzalna w kW.




moc gwarantowana w kW.




kable zasilające 5 kV w km.




kable zasilające 15 kV w km.




kable zasilające 35 kV Szramoty w km.




kable rozdzielcze 5 kV w km.




kable rozdzielcze NN w km.




zapalono lampy uliczne w szt.




stacje transformacyjne w szt.




remont budynków w %



remont podstacji w %



posesje pod napięciem



miesiące	ilość abonentów na terenie W. wy. lewobrzeżnej		posesje pod napięciem W. wy. lewobrzeżnej	
	1946	1947	1946	1947
I	6960	6960	321	321
II			210	531

miesiące	stan zatrudnienia w Elektrowni i stacjach miesięczne			
	umysłowi	1946	1947	1948
I	717	28	1843	72
II	750	23	1917	72
III	804	30	1936	70



na 1000 mieszkańców w m³/dobę

21
1-3.86
4103-4389
do 1.1.46

średni wydatek wody w tys. m³/dobę


3975-41.01

zadanie Stacji Pomocy w tys. m³ d.

--

zadanie Stacji Pomocy w tys. m³ d.

11-40.00
11 40.00
150.00

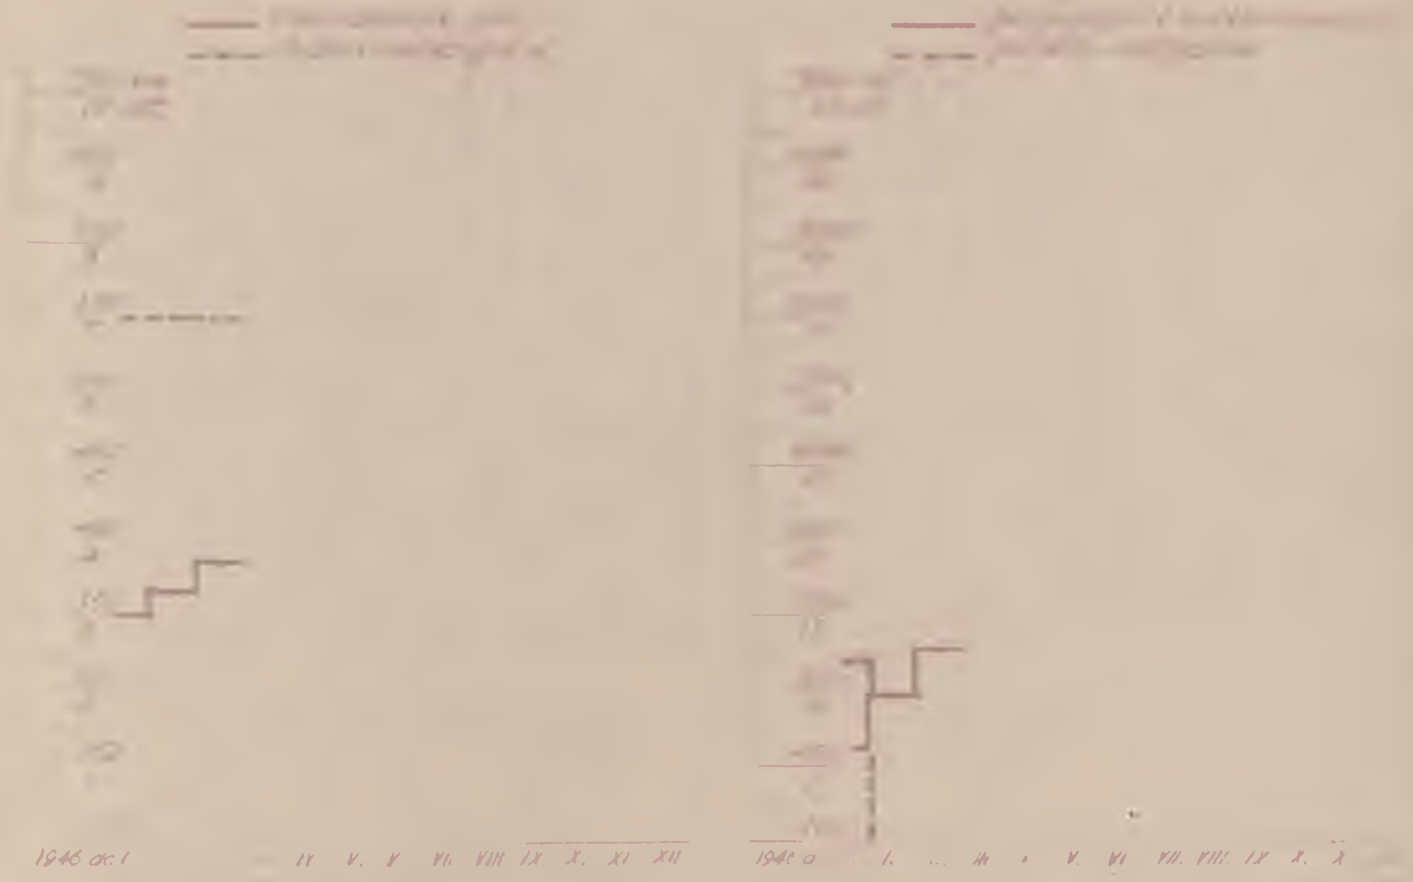

na 1000 mieszkańców w km

plan
realizacja mies.
ogółem

studnie artezyskie w szt.


0-0
do 1.1.46

przyłączenie nieruchomości w szt.

plan
realizacja mies.
ogółem

punkty czerpalne w szt.

1-12
1-0
do 1.1.46

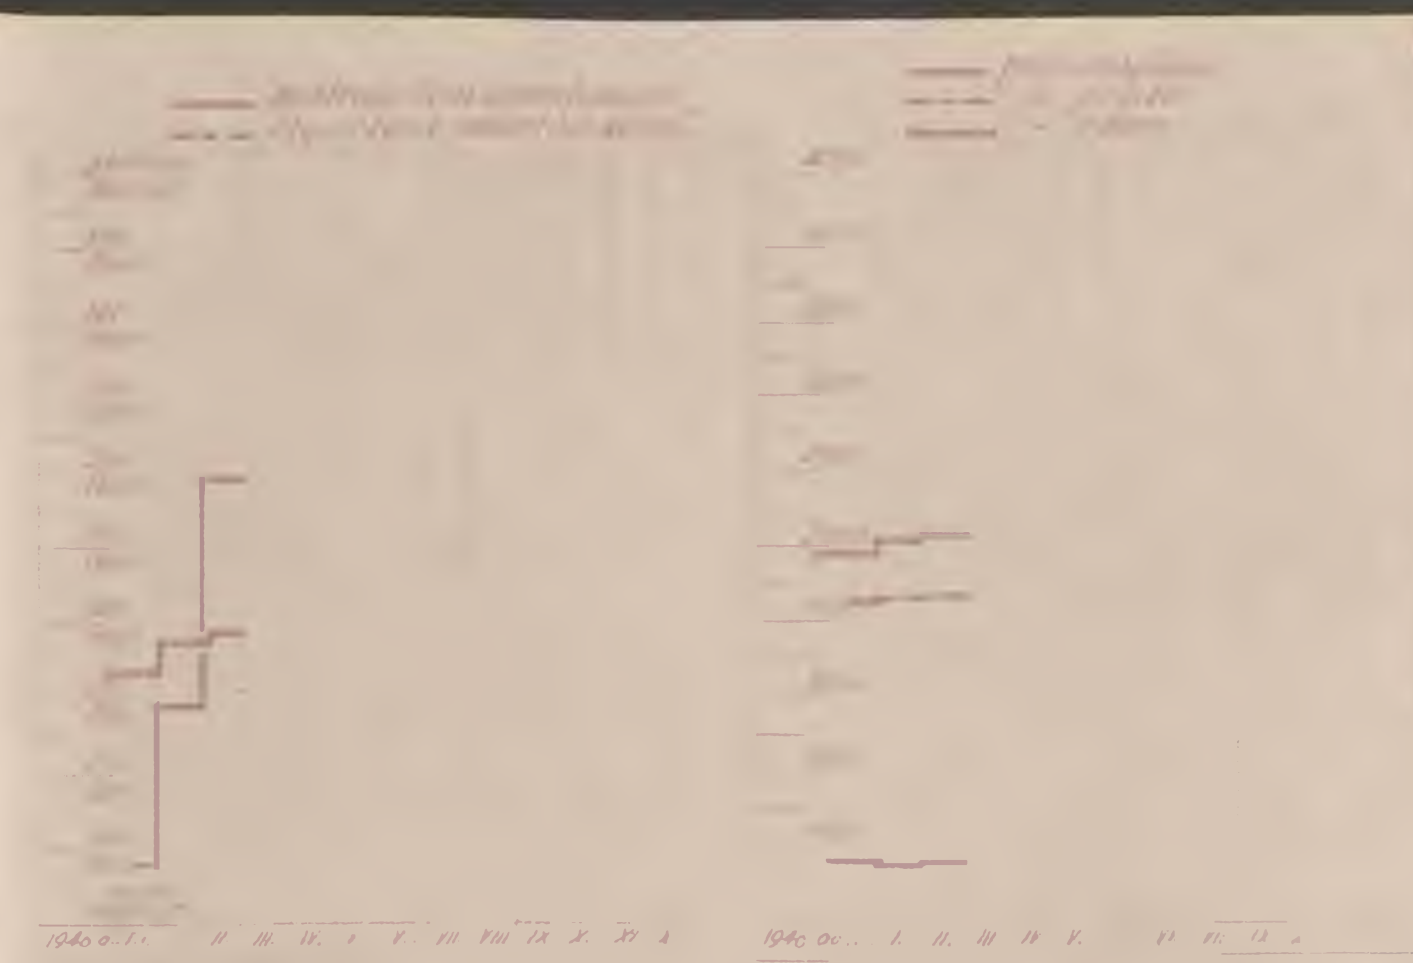

kontrola sieć kanaliz. w km.

1-43.77
23 104.48
175.00 218.77 279.48
do 1.1.

miejsc	kontrola tras kanalizacyjnych		czyszczenie obiektów kanalizacyjnych	
	w mies. wr. 1946	ogółem	w mies. wr. 1946	ogółem
do 1.1.		175.00		1346
I.	43.77	43.77	23	23
II.	60.71	104.48	12	40

S. m. i. c.	stan zarządzić c. c.		stanie miesięczne		razem	
	umy. towi	f. i. j. c. ni	ilość	%	ilość	%
do 1.1.	327	16				
I.	324	16	1678	84	2002	100
II.	331	16	1681	84	2012	100

GAZOWNIA

— produkcja gazu
— zdolność produkcyjna

— oabudowa sieci
— sieć w eksploatacji




— remont fabryki chemicznej gazu




— remont budynków



— przyłączenie nieruchomości
— ilość konsumentów





— pr. umysłowi
— fizyczni
— razem



produkcja gazu w tys m³/dobę


remont fabryki chemicznej u %

ilość konsumentów




zdolność produkcyjna w tys m³/a

remont fabryki gazu u %



oabudowa sieci w km

remont budynków w %










plan




miesiąc	przyłączenie nieruchomości			ilość konsumentów		
	w mies.	w r. 1946	ogół.	w mies.	w r. 1946	ogół.
do I			172			6477
I	78	78	850	1240	1240	7717
II	147	225	997	906	2146	8623

miesiąc	stan zatrudnienia w GAZOWNI średnie miesięczne					
	umysłowi		fizyczni		razem	
	ilość	%	ilość	%	ilość	%
do I	156	18	712	82	868	100
I	156	18	712	82	868	100
II	158	18	722	82	880	100

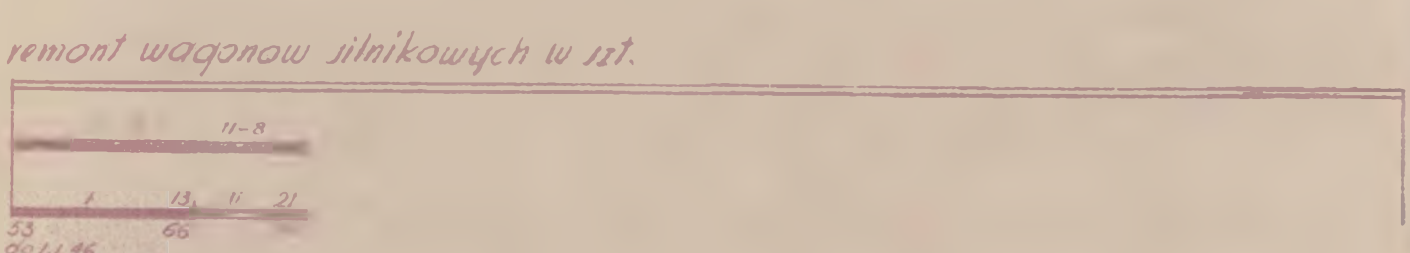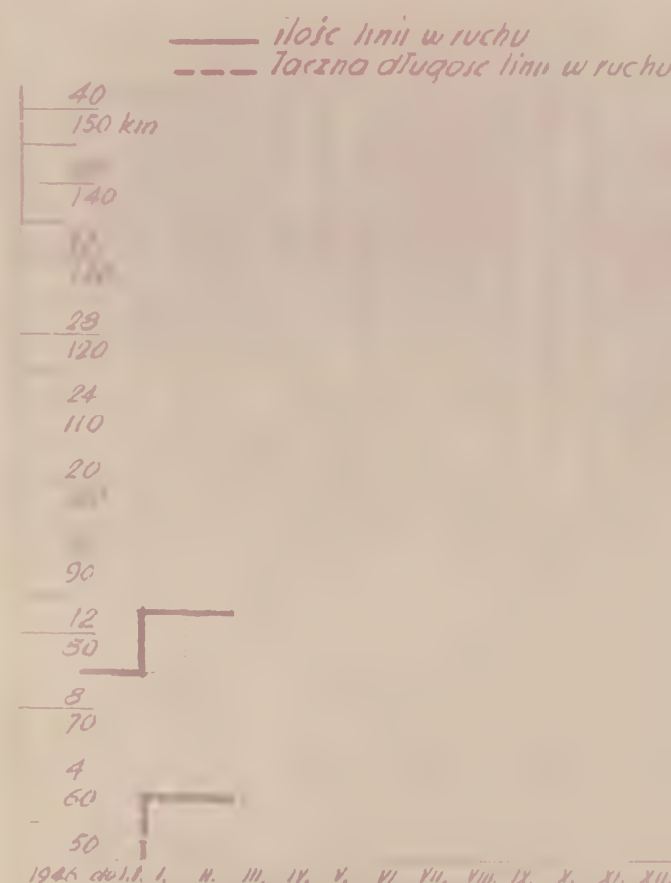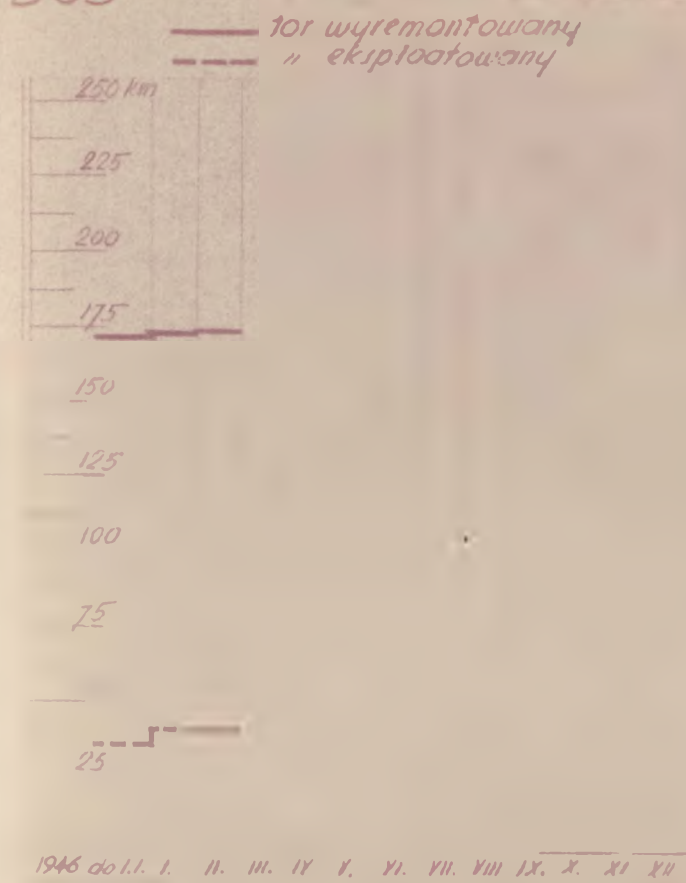

roboty ziemne


konserwacja kanał krytych
" otwart.

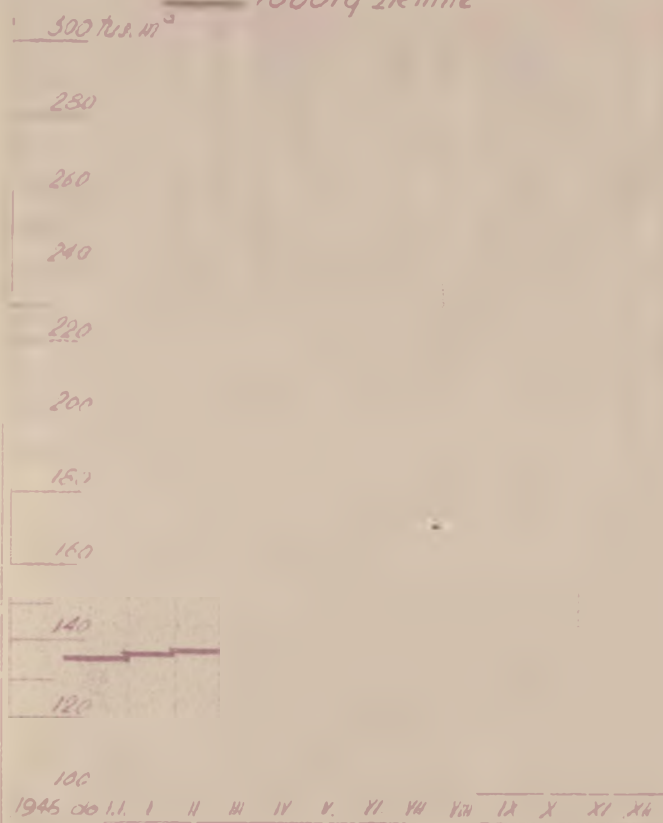


roboty ziemne w tys. m³

130,71 138,33
do 1.1.46

konserwacja kanałów krytych w km




konserwacja kanałów otwartych w km



Most im Ks Pomiatowskiego

odbudowa wiaduktu

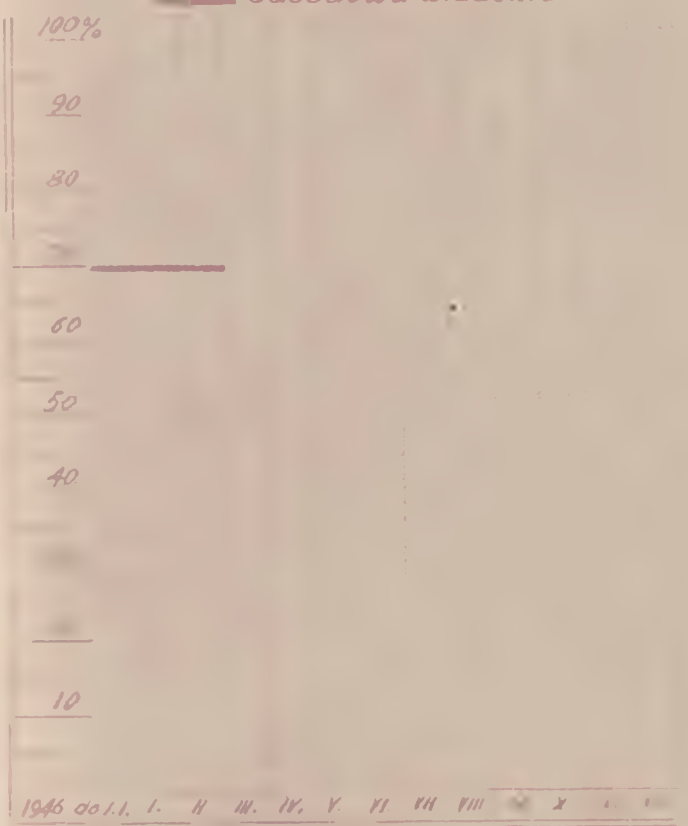


Most przy ul. Karowej

przebudowa izbic
budowa nowych izbic




Most kolejowy k. Cytadeli

usunięcie konstr. z nurtu wiatry
odbudowa podpór

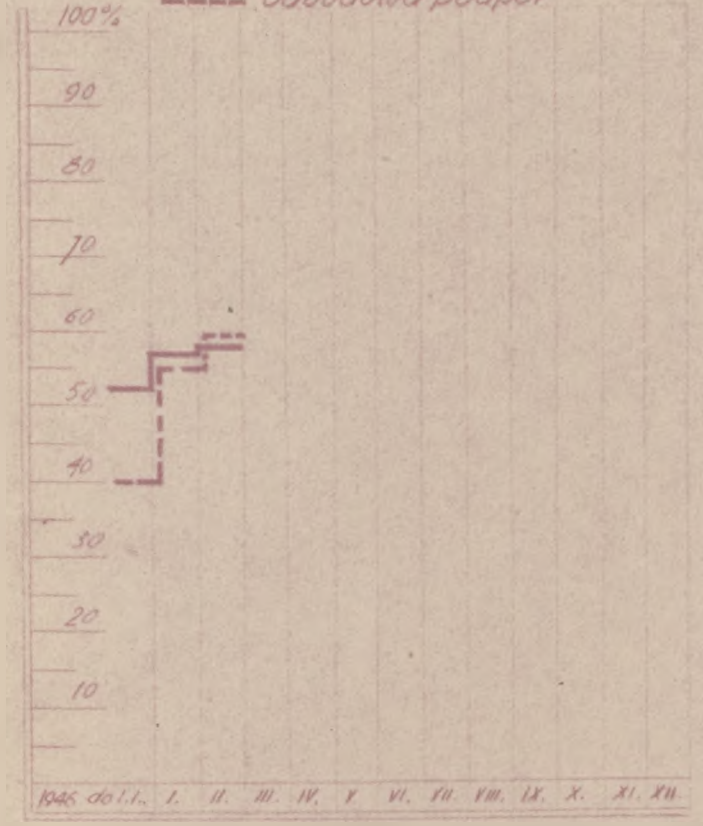


Most kolejowy k. Cytadeli

budowa izbic

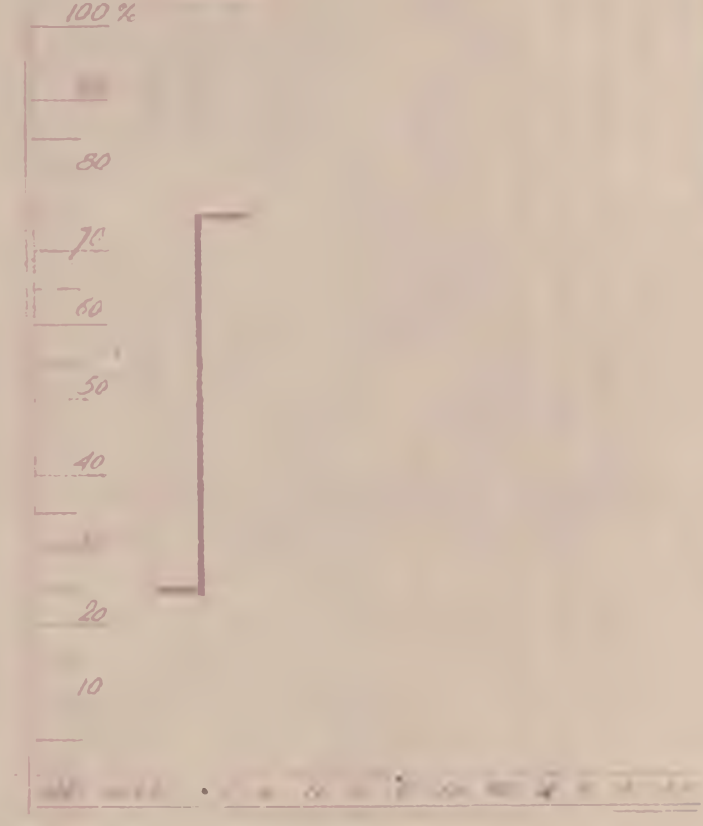


most im. Ks. Pomiatowskiego w % (odbudowa wiaduktu)




przebudowa izbic przy moście k. Karowej w %




budowa nowych izbic j.w. w %




most kolejowy k. Cytadeli - usunięcie konstr. z nurtu wiatry



most kolejowy k. Cytadeli - odbudowa podpór



most kolejowy k. Cytadeli - budowa izbic



roboty ziemne
zabrukowanie jezdni

ułożenie chodników
" krawężników

90 tys. m³
300 tys. m²

40 tys. m²
m²

75
28.7

37

70
260

261
34

240

240
31

220

55

50

180

166

19

140



16

120

13

10 tys. m²


10 tys. m²



roboty ziemne w tys. m³




zabrukowanie jezdni w tys. m²



ułożenie chodników w tys. m²



ułożenie krawężników w km b.



BOS

WYBUDOWA I REMONT NIERUCHOMOŚCI

----- kubatura oddana do użytku

----- bud. mieszk.

----- bud. inne

1000 tys. m³

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000

6000

5000

10000

9000


6000

5000

10000

9000</

rozbiork: stopów
wytobycie zelaza



068547
06/1/95

BOS

STAN ZATRUDNIENIA W BOS I SPB

X

wg. średnich miesięcznych

— zatrudn. — fiz. — prac. razem

21000 BOS

20000 SPB

18000

14000

12000

10000

8000

12000

10000

6000

1946 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

miesiąc	Stan zatrudnienia w BOS		
	ogółem		
I	1421		
II	1421		

miesiąc	Stan zatrudnienia w SPB					
	stan fizyczny					
	umysłowi	fizyczni	razem			
I	1485	19.2	6243	80.8	7728	100
II	1485	19.2	6243	80.8	7728	100

